



REPUBLIQUE DU SENEGAL
UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI



RAPPORT FINAL
SUIVI DES INFRASTRUCTURES : CONSTRUCTION ET
EQUIPEMENT D'ECOLE



Décembre 2005



MS et Associés

Sicap Sacré Cœur 3 villa n°33 Dakar – Sénégal – BP : 24186 – Tel : 865 11 80/ Fax : 867 23 79 E.mail : masow@sentoo.sn / msadakar@sentoo.sn

EXPOSE PRELIMINAIRE

Le **Fonds de Développement Social** est un programme conçu par le Gouvernement du Sénégal avec le concours de la Banque Mondiale dans le cadre de son programme de lutte contre la pauvreté. Ses principaux objectifs sont de :

- Faciliter l'accès des couches sociales démunies aux services sociaux de base, aux équipements et aux infrastructures communautaires ;
- Améliorer les conditions de vie des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables par la promotion et le financement d'activités génératrices de revenus et d'emplois ;
- Renforcer les capacités des communautés de base dans la planification participative, la priorisation des besoins et l'exécution de leurs activités ;
- Renforcer les capacités de l'Administration dans l'analyse et le suivi des conditions de vie des ménages et la mise en œuvre du programme de lutte contre la pauvreté.

Les activités sont menées à travers quatre (4) composantes :

- **Composante 1** : Amélioration de l'accès aux infrastructures, équipement et services sociaux de base
- **Composante 2** : Accès aux services de Micro finance,
- **Composante 3** : Renforcement des capacités des groupes vulnérables et des OCB
- **Composante 4** : Suivi et analyse des conditions de vie des ménages et des communautés

En conformité avec la politique de l'Etat et sur la base de l'accord conclu avec la Banque Mondiale, le Gouvernement a décidé de confier la gestion du Projet « **Fonds de Développement Social** » à l'**Agence du Fonds de Développement Social 'AFDS**) en qualité d'organisme de mise en œuvre du Projet.

A ce titre, l'**A F D S** contracte avec les **Organisations Communautaires de Base (OCB)** pour le financement des Micro-Projets dont elles ont la responsabilité de la mise en œuvre, avec l'appui d'**Opérateurs d'Appui au Développement Communautaires (OADC)** recrutés par

L'A F D S.

I / PRESENTATION DU PROJET FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

Le projet « Fonds de Développement Social » est un programme décennal, conçu dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté, financé au moyen d'un crédit de l'IDA, de contributions diverses provenant de l'Etat et des bénéficiaires, ainsi que d'autres bailleurs de fonds qui décideraient d'y participer.

II / OBJECTIFS

L'objectif général du projet est de contribuer à réduire la pauvreté au Sénégal par :

- l'amélioration de l'accès des communautés dans les zones rurales et urbaines les plus pauvres aux services sociaux de base,
- le financement des Micro-Projets de développement grâce à des subventions consenties aux Organisations Communautaires de Base (OCB)

SITUATION D'ENSEMBLE PAR TYPE D'INFRASTRUCTURE / ECOLE

DATES REPERES																	17 appréc iat;/tra vaux
REF.DMP / LOCALITES	MAÎTRISE D'ŒUVRE						ENTREPRISES						EQUIPEMENTS				
	1 signat	2 date de démarr	3 délai de contrc t.(jrs)	4 délai exécu t(fjrs)	5 date réception jrs)	6 écart(signat.c ont	7 date signat.c démarr	8 délai contr(J rs)	10 délai exéc ut.(jr s)	11 date récepti on	12 écart(jrs)	13 date signat.co nt	14 délai livrais	15 date réceptio n	16 écart		
KLKA / I E -040-04 KHOURY LOUMBY	15-févr	22-fevr	67	150	19-juil	83	10-mars	15-mars	45	121	12-juil	76	13-sept 20j	30-sepi		0 Bien	
KLKA / I E -041-04 BOGUEL	15-févr	22-fevr	67	207	13-sept	140	13-mars	18-mars	45	173	6-sept.	128	13-sept 20j	30-sepi		0 Bien	
KLKA / I E -042-04 KEUR ABLAYE FANTA	16-févr	23-févr	67	156	20-juil	89	5-mars	15-mars	45	126	13-juil	81	14-sept 20j	1-oct		0 Bien	
KLKA / I E-043- 04WANDE	14-févr	21-févr	67	145	12-juil	78	6-mars	11-mars	45	117	5-juil	72	13-sept 20j	30-sepi		0 Bien	

LEGENDE

I / MAÎTRISE D'ŒUVRE

1 Date de signature du contrat du Maître d'Œuvre

2 Date de démarrage (une semaine après la signature de contrat) des prestations de service du M.O

3 Délai prévu par le DSCI

4 Durée réel d'exécution des travaux de construction rajouté de 7 jours pour le dépôt du

5 Date de dépôt du rapport du M.O (une semaine après la réception provisoire des travaux)

6 Ecart entre le délai contractuel et le d'exécution (4" - "3)

II / ENTREPRISE

7 Date de signature de contrat Entreprise

8 Date de démarrage des travaux de construction

9 Délai contractuel des travaux

10 Durée d'exécution des travaux

11 Date de Réception des travaux

12 Ecart entre le délai d'exécution et le délai contractuel (10" - "9)

III / EQUIPEMENT :

14 Délai de livraison contractuel pour les équipements

15 Date de réception des équipements

16 Ecart entre la date de réception et le délai contractuel (15" - "14)

17 Appréciation -Notation de la qualité des travaux

CONSTATS ET COMMENTAIRES	RECOMMANDAZTIONS
Difficultés à mobiliser la communauté pour l'apport durant tout le processus Sécurité des élèves non assurée dans certaines localités Utilisation de l'espace alloué à l'école à d'autres objectifs généralement p Manière dont est fin au mandat du comité de gestion démotivante Insuffisance du nombre de boxes des latrines Absence de magasin de stockage de denrées alimentaires La non participation à l'apport des autres villages polarisés	Augmenter les allocations afin de pouvoir construire un mur de clôture charger la pérennisation. Parceque les membres du comité de gestion ne s'expliquent le fait eux s'investissent durant tout le processus d'avant Elargir le comité aux autres villages polarisé vue le caractère collectif du

OBSERVATIONS: TOUTES LES SALLES DE CLASSE SONT FONCTIONNELLES; ELLES ONT OUVERT A LA MÊME PERIODE QUE LES AUTRES AVEC LEURS EQUIPEMENTS ET FOURNITURES A L'EXCEPTION DE KEUR ABLAYE FANTA QUI A ACCUSE UN LTGER RETARD DU A LA NON DISPONIBILITE A TEMPS DES FONDS DE LA DEUXIEME TRENCHÉ

D M P N°: KLKA /I E -041-04

BOGUEL

RAPPORT FINAL

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	Groupement villageois de Boguel
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -041-04
Titre du Micro-Projet	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe plus bureau du directeur
Maître d'Œuvre	Saliou DEME
Montant Contrat	950.000
Entreprise	GIE Salam
Montant Offre	9.188.500
Apport Bénéficiaires	858.055
Montant Marché	8.458.396
Date de Signature du Contrat	13/03/2005
Date de Démarrage	18/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Prévue	24/04/2005
N° Rapport	Final
Période	Fin de mission
Village	Boguel
Communauté Rurale	Ndioum Ngainth
Arrondissement	Malem Hodar
Département	Kaffrine
Région	Kaolack


PERSONNEL INTERVENANT		
Structures	Statut	Noms
Comité de Gestion du Micro Projet	Président	Mamadou DIOUF
	CTMO	Aliou DIOUF
	CTMO	Marcel NDIAYE
	CTMO	Saye NDOUR
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARES	Coordonnateur	Modou DIOP
	Spécialiste Régional de de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine SAGNA
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonnateur	Amath SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine DIOP
	Animateur de Zone	Idrissa BA

SITUATION TECHNIQUE				
	Prévu		3 Réalisé %	4 Ecart %
	Désignation	% par corps d'état		
Bloc Salles de Classe	I /Trerrassement	100	100	0
	II /Gros Œuvre	100	100	0
	A/Fondations	100	100	0
	B/Elévation	100	100	0
	III/Charpente Toiture	100	0	100
	I V / Menuiseie	100	100	0
	Peinture	100	100	0
Latrines	I / Terrassement	100	100	0
	II /Gros Œuvre	100	100	0
	III/Toiture Charpent	100	100	0
	IV/Menuiserie	100	100	0
	Plomberie	100	100	0
	Peinture	100	100	0


II / FINANCIERE					OBSERVATIONS
BUDGET	MARCHE	RELICAT			
		MONTANT	UTILISA TION	SOLDE	
			MONT		
10100867	8458393	1642474	1471000	171474	.Utilisation du reliquat autorisée pour la construction d'un magasin de stockage de denrées alimentaires

SYNTHESE											
CONSTRUCTION											
REPERES		INDICATEURS					EQUIPEMENT		FOURNITURES		
Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de récept	Niveau d'Avancement	1 Durée des travaux	2 Ecart	Notes	Classement Général	RECEP	NON RECEP	REC	NON RECEP
18/03/2005	45 j	6/09/2005	100%	173j	128j			oui		oui	
vison sans interruption permanente de la communauté. via une gestion en dépit de la présence d'un technicien a qui pratiquement n'est délégué aucune responsabilité.. Bonne qualité du travail. Bonne conformité technique.L'entrepreneur permet énormément de temps en prospection de fournisseurs. Il y a à souligner le dynamisme du relai communautaire par sa disponibilité malgré son handicap. Le reliquat a été utilisé pour construire un magasin de stockage de denrées alimentaires et d'espace de restauration sur demande de la communauté et accord de l'association (voir plan en annexe)											
OBSERVATIONS											
RECOMMANDATION											
Construire un mur de clôture pour sécuriser l'école située à proximité de la route											


emplacement
Enseigne

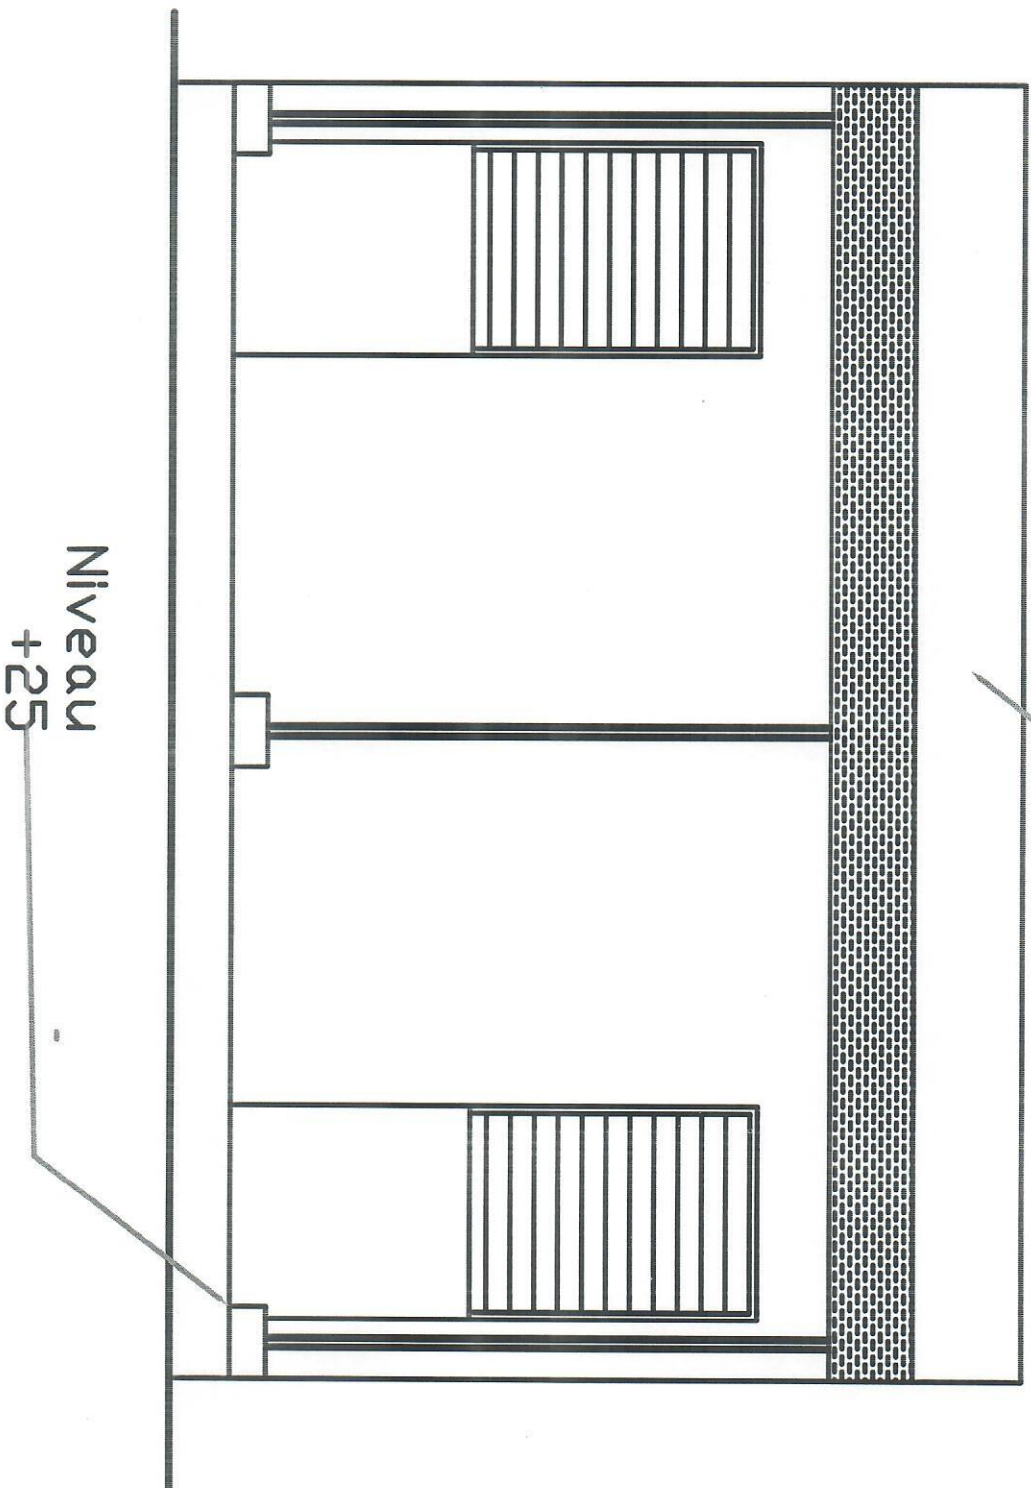

Façade Principale

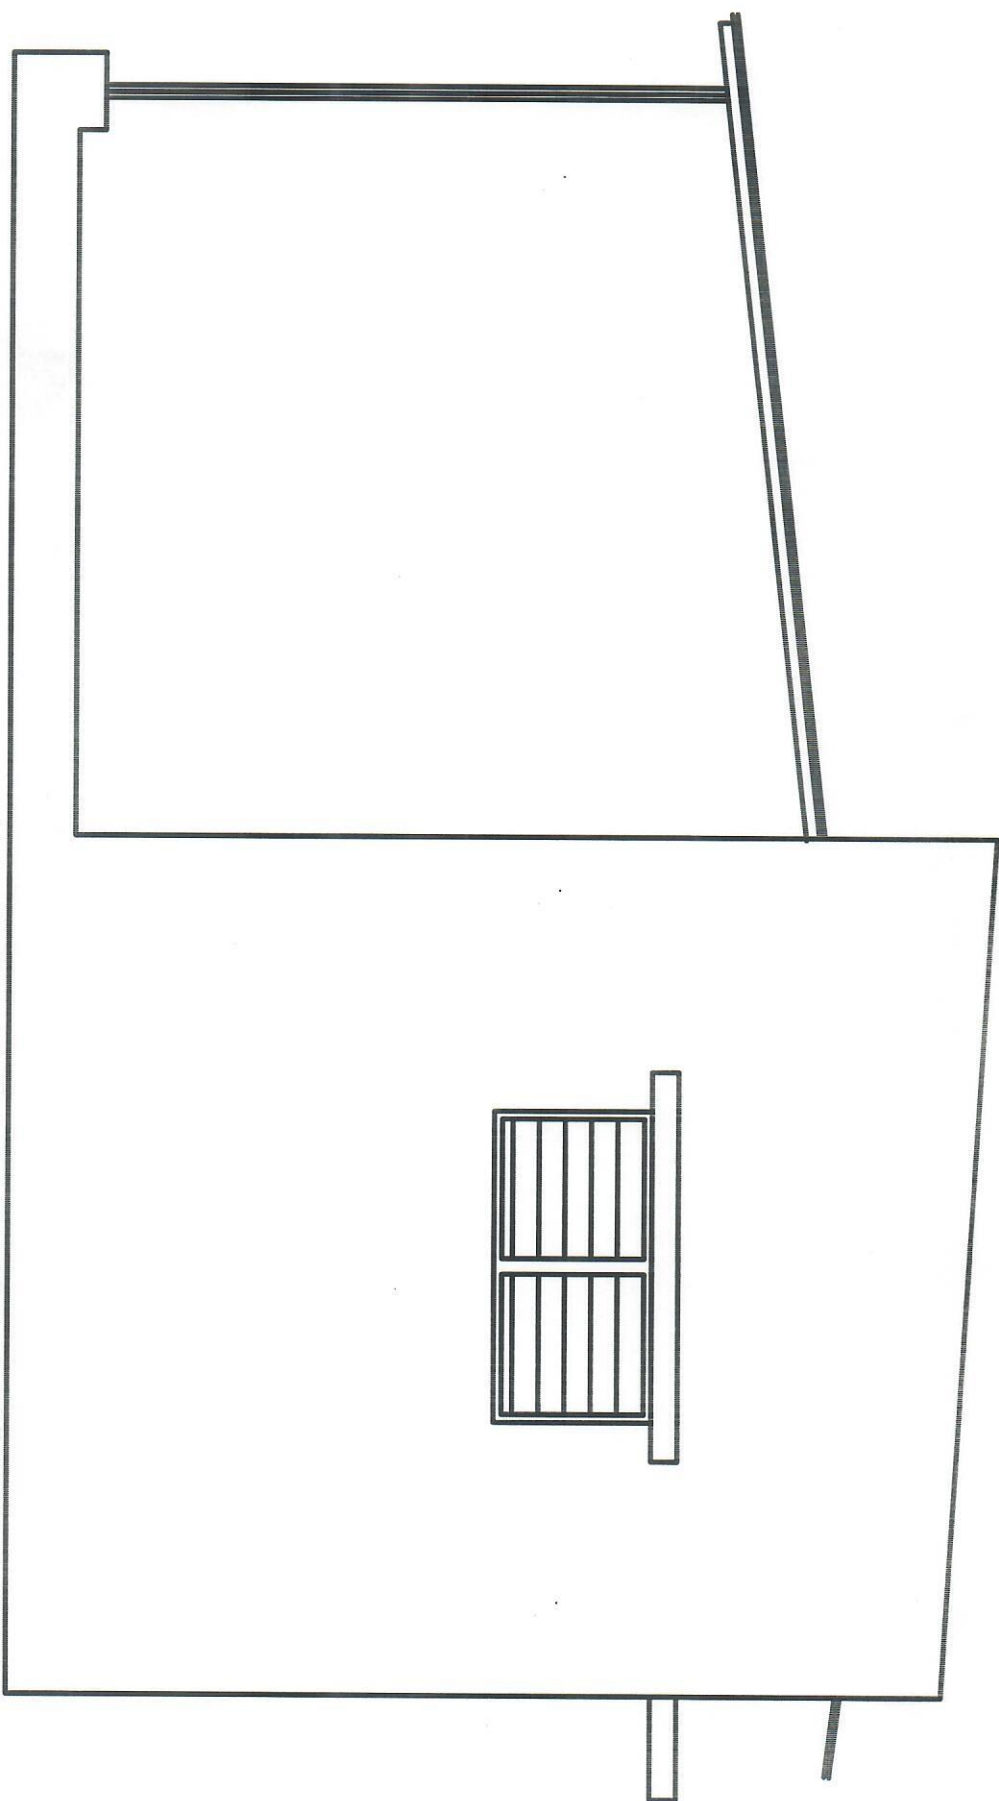

Façade Latérale

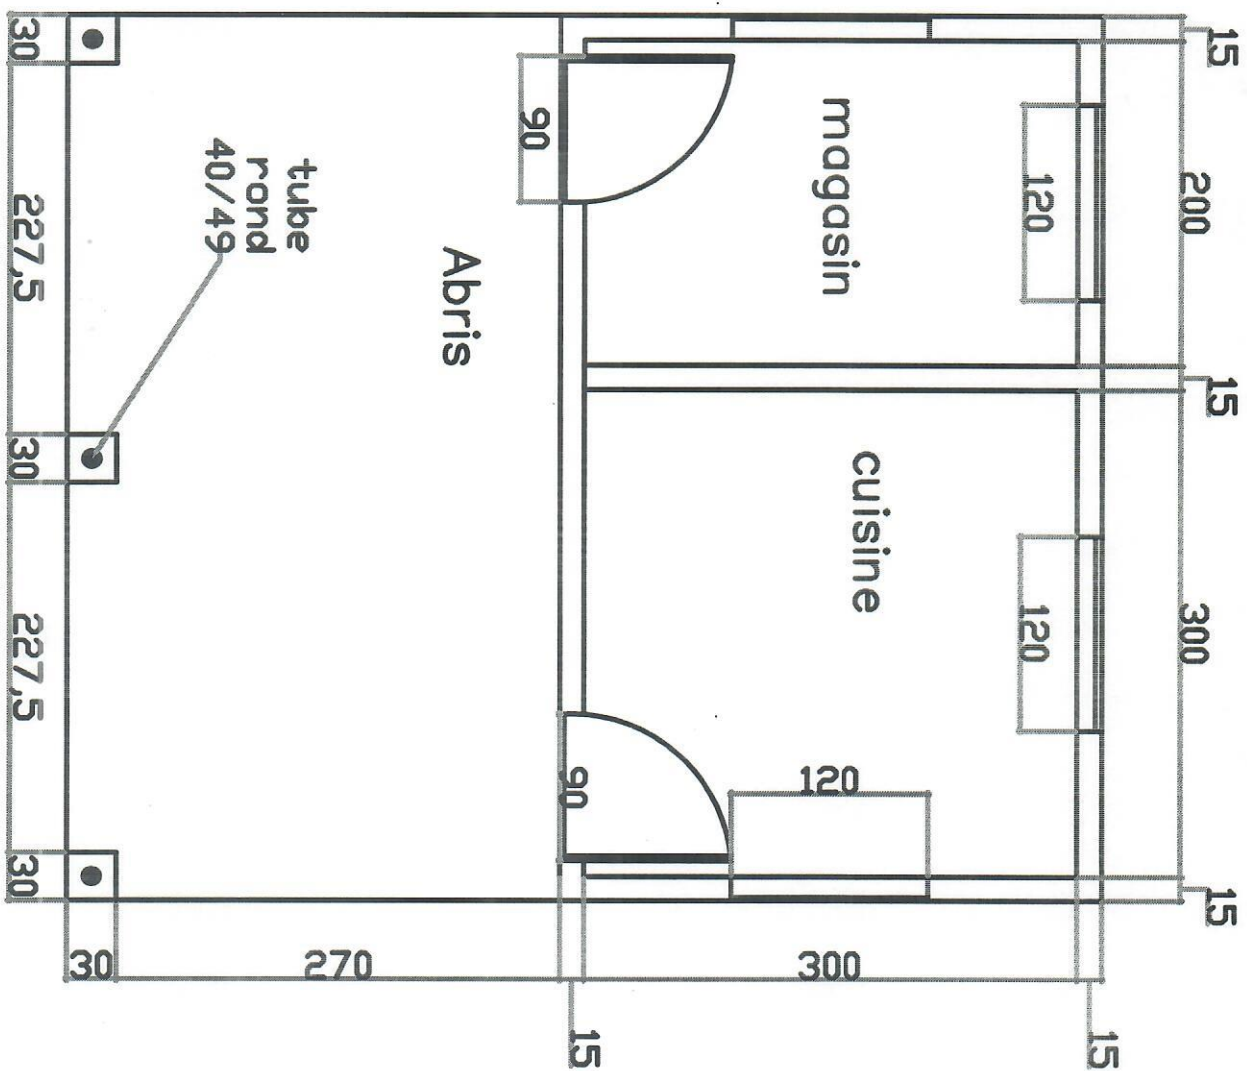

Magasin de Stockage D.Alim./
Cantine Scolaire/Vue en Plan

D M P N°: KLKA /I E -040-04

KHOUROU
LOUMBY

RAPPORT FINAL

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	Association des Parents d'Elèves
N° du Micro-Projet	N° 040 / IE-KLKA- 04
Titre du Micro-Projet	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe plus bureau du directeur
Maître d'Œuvre	Saliou DEME
Montant Contrat	950.000
Entreprise	GIE Khoylane
Montant Offre	9.028.338
Apport Bénéficiaires	858.055
Montant Marché	8.170.283
Date de Signature du Co	10/03/2005
Date de Démarrage	15/03/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Prévue	24/04/2005
N° Rapport	Final
Période	Fin de mission
Village	Khourou Loumby
Communauté Rurale	Ndioum Ngainth
Arrondissement	Malem Hodar
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

PERSONNEL INTERVENANT			
Structures	Statut	Noms	
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Coumba	SALL
	CTMO	Talla	THIAM
	CTMO	Ousmane	SARR
	CTMO	Saér	GUEYE
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonnateur	Modou	DIOP
	Spécialiste Régional de de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine	SAGNA
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonnateur	Amath	SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine	DIOP
	Animateur de Zone	Idrissa	BA

	Prévu			3 Réalisé %	4 Ecart %
	Désignation	% par Poste	% par corps d'état		
Bloc Salles de Classe	I /Trerrassement		100	100	0
	II /Gros Œuvre		100	100	0
	A/Fondations	100		100	0
	B/Elévation	100		100	0
	III/Charpente Toiture		100	0	100
	I V / Menuiserie		100	100	0
	Peinture		100	100	0
Latrines	I / Terrassement		100	100	0
	II /Gros Œuvre		100	100	0
	III/Toiture Charpent		100	100	0
	IV/Menuiserie		100	100	0
	Plomberie		100	100	0
	Peinture		100	100	0

II / FINANCIERE						OBSERVATIONS
BUDGET	MARCHE	RELIQUAT				
		MONTANT	UTILISA		SOLDE	
			MONT			
10100867	8170283	1930584	0		1930584	Demande non formulee

SYNTHESE											
CONSTRUCTION						EQUIPEMENT		FOURNITURES			
REPERES			INDICATEURS				SITUATION		SITUATION		
Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de récept	Niveau d'Avancem ent	1 Durée des travaux	2 Ecart	Notes	Classe ment Général	RECEP	NON RECEP	RECEP	NON RECEP
15/03/2005	45 j	12/07/2006	100%	121j	76j			oui			oui
Réiscence à la participation à l'approvisionnement en matériaux locaux tout au début des travaux ,mais après intervention du coordonnateur de l'OADC les choses sont redevenues normales.La communauté s'est ressaisie et depuis lors tl n'y a plus eu de rupture de matériaux locaux..ette situation n'est pas pas entièrement responsable de tout le retard.II y a aussi la phase liée à l'attente de la livraison de la peinture passée en commande groupée et qui a durée pratiquement 21jours.Bonne organisation.Bonne qualité des travaux.Suivi régulier et constant de la maîtrise d'oeuvre.											
OBSERVATIONS											
RECOMMANDATIONS											
Clôturer l'école pour la sécurité des élèves.											

D M P N°: KLKA /I E -042-04

KEUR ABLAYE
FANTA

RAPPORT FINAL

IDENTIFICATION DU PROJET	
Nom OCB	Groupement villageois de Keur Ablaye Fanta
N° du Micro-Projet	KLKA / IE -042-04
Titre du Micro-Projet	Construction et Equipement d'un Bloc de deux Salles de Classe plus Bureau du Directeur
Maître d'Œuvre	Khalifa Ababcar FALL
Montant Contrat	950.000
Entreprise	Business center
Montant Offre	8.446.769
Apport Bénéficiaires	900.555
Montant Marché	7.546.214
Date de Signature du Contrat	6/04/2005
Date de Démarrage	11/04/2005
Délai Prévu	45 jours
Date de Livraison Prévue	24/04/2005
N° Rapport	1
Période	Mars /Avril 2005
Village	Keur Ablaye Fanta
Communauté Rurale	Ida Mouride
Arrondissement	Maka Yop
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

PERSONNEL INTERVENANT			
Structures	Statut	Noms	
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Chérif	CISSE
	CTMO	Moussa	CISSE
	CTMO	Cheikh	CISSE
	CTMO	Daouda	CISSE
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonnateur	Modou	DIOP
	Spécialiste Régional de de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine	SAGNA
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonnateur	Amath	SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine	DIOP
	Animateur de Zone	Khady Konaré	TRAORE

I / SITUATION TECHNIQUE				
	Prévu		3	4
	Désignation	% par corps d'état	Réali sé%	Ecart %
Bloc Salles de Classe	I /Terrassement	100	100	0
	II /Gros Œuvre	100	100	0
	A/Fondations	100	100	0
	B/Elévation	100	100	0
	III/Charpente Toiture	100	0	100
	I V / Menuiserie	100	100	0
	Peinture	100	100	0
	I / Terrassement	100	100	0
	II /Gros Œuvre	100	100	0
	III/Toiture Charpent	100	100	0
Latrines	IV/Menuiserie	100	100	0
	Plomberie	100	100	0
	Peinture	100	100	0

II / FINANCIERE						OBSERVATIONS
BUDGET	MARCHE	RELIQUAT				
		MONTANT	UTILIS		SOLDE	
			ATION	MONT		
10105142	7546214	2558928			2558928	Demande d'utilisatiopn du reliquat pour la connection de l'école au réseau d'adduction introduite

SYNTHESE											
CONSTRUCTION								EQUIPEMENT		FOURNITURES	
REPERES			INDICATEURS					SITUATION		SITUATION	
Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de récept	Niveau d'Avanc	Durée des	2 Ecart	Notes	Classe ment	RECEP	NON RECEP	RECEP	NON RECEP
10/03/2005	45 j	13/07/2005	100%	126j	81j			oui		oui	
OBSERVATIONS Déficit de mobilisation de la communauté. En effet seuls quelques membres du bureau assuraient l'approvisionnement des matériaux locaux. Cette situation a beaucoup contribué au retard noté sur le calendrier. Bonne conformité technique. Bonne gestion. Bonne qualité des travaux											
RECOMMANDATIONS Clôturer l'école mieux pour la sécuriser et autoriser l'utilisation du reliquat pour la connection vue la position plus ou moins éloignée de l'école par rapport au village.											

D M P N°: KLKA /I E -043-04

WANDE

RAPPORT FINAL

IDENTIFICATION DU PROJET	
N° du Micro-Projet	KLKA/IE- 40-04
Titre du Micro-Projet	Construction et Equipement d'un Bloc de deux Salles de Classe plus Bureau du Directeur
Maître d'Œuvre	Bouna DIOUF
Montant Contrat	650.000
Entreprise	GIE Merganène
Montant Offre	7.639.241
Apport Bénéficiaires	804.484
Montant Marché	6.834.757
Date de Signature du Contrat	6/03/2005
Date de Démarrage	11/03/2005
N° Rapport	Final
Période	Fin de mission
Village	Wandé
Communauté Rurale	Dianké Souf
Arrondissement	Malem Hodar
Département	Kaffrine
Région	Kaolack

PERSONNEL INTERVENANT			
Structures	Statut	Noms	
Comité de Gestion du Micro-Projet	Président	Mor	DIOP
	CTMO	Malla	DIOP
	CTMO	Alassane	NDAO
	CTMO	Mbaye	NDAO
Agence Régionale du Fonds de Développement Social/ARFS	Coordonnateur	Modou	DIOP
	Spécialiste Régional de de la Passation des Marchés	Mamadou Lamine SAGNA	
Opérateur d'Appui Au Développement Communautaire	Coordonnateur	Amath	SY
	Responsable des Infrastructures	Lamine	DIOP
	Animatrice de Zone	Ndèye Fatou	DIOP

SITUATION TECHNIQUE					
Prévu du 18/06 au 17/07 / 05			3 Réalisé %	4 Ecart %	
Désignation	%par Poste	% par corps d'état			
Bloc Salles de Classe	I /Terrassement		100	100	0
	II /Gros Œuvre		100	100	0
	A/Fondations	100		100	0
	B/Elévation	100		100	0
	III/Charpente Toiture		100	100	0
	I V / Menuiserie		100	100	0
	Peinture		100	100	0

II / FINANCIERE						OBSERVATIONS
BUDGET	MARCHE	RELIQUAT				
		MONTANT	UTILISA		SOLDE	
MONT						
8905535	6834757	2070778			2070778	.Autorisation d'utilisatiopn du reliquat pour la réhabilitation et l'harmonisation de deux salles de classe existantes accordée

SYNTHESE											
CONSTRUCTION								EQUIPEME NT		FOURNITURES	
REPERES				INDICATEURS				SITUATION		SITUATION	
Date de Démarrage	Délai Prévu	Date de récept	Niveau d'Avance ment	1 Durée des travaux	2 Ecart	Notes	Classem t Général	RECE P	NON REC EP	REC EP	NON REC RECEP
11/03/2005	45 j	5/07/2005	100%	122j	77j			oui		oui	
OBSERVATIONS Malgré la faiblesse de ses moyens l'entrepreneur a su relevé le défi et être parmi les plus performant par rapport à la maîtrise des délais. Absence de moyens mias volonté de respecter ses engagements. A encourager. Le dynamisme la disponibilité et l'investissement personnel du président est à louer. En effet durant tout le processus le président à eu s'investir pratiquement tout seul pour la réussite du micro projet. Bonne qualité des travaux. Bonne conformité technique. La réhabilitation des deux salles de classe accordée a été faites et l'kes travaux réceptionnés.											
RECOMMANDATIONS Cloîurer l'école pour la sécurité des élèves. En effet l'école est située en bordure de route à grande circulation (moins de 10m)											

ANNEXES
