

REPUBLIQUE DU SENEGAL

AGENCE DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL



Immeuble EPI, 1er étage. Rue 1 X Boulevard du Sud.
Tél. : 865 22 56 - BP : 16324 Dakar

COMPOSANTE 1

**AMELIORATION DE L'ACCES AUX INFRASTRUCTURES,
EQUIPEMENTS ET SERVICES SOCIAUX DE BASE**

**MISSION DE SUPERVISION DU PROJET FONDS DE
DEVELOPPEMENT SOCIAL**

(Du 21 au 27 novembre 2005)

Novembre 2005

INTRODUCTION

La présente note fait le point sur l'état d'exécution technique et financière de la composante 1. Elle part du bilan de la dernière supervision du 04 au 15 juillet 2005 et résume les différentes réalisations effectuées à partir de cette date. Ces réalisations s'articulent autour des points ci-dessous :

- Exécution technique de la composante
 - Achèvement et clôture des micro projets de services sociaux de base restants de la 1^{ère} vague
 - Exécution, achèvement et clôture de la 2^{ème} vague de microprojets de services sociaux de base
 - Répartition par secteur des microprojets exécutés au cours de la 1^{ère} phase du Projet Fonds de Développement Social (vagues 1 et 2)
 - Formations spécifiques, IEC et VIH/SIDA
- Exécution financière de la composante
- Capitalisation des activités de la Composante
- Perspectives d'ici mars 2006

I- EXECUTION TECHNIQUE DE LA COMPOSANTE

1.1 Achèvement et clôture de la 1^{ère} vague des micro projets de services sociaux de base

1.1.1 Rappel :

Sur un total de 271 micro projets de la 1^{ère} vague, 259 ont été clôturés au 30 juin 2005, soit 96 % d'achèvement. Seuls 12 MP situés dans la zone sylvo-pastorale étaient en cours d'exécution parmi lesquels 4 situés dans la région de Louga étaient résiliés à cause de la non mobilisation des apports par les OCB bénéficiaires due à des problèmes de transhumance et de soudure. Les 8 autres MP devraient s'achever et clôturer avant fin juillet 2005.

1.1.2 Etat d'avancement des 12 MP :

Au 15 novembre 2005, tous les 12 MP sont achevés et clôturés. Les 4 MP qui étaient résiliés ont été remplacés au profit d'OCB du département de Kébémér, même région.

En définitive, 100 % des MP de la première vague sont achevés et clôturés. Les documents d'auto évaluations et de clôture sont disponibles.

Tableau récapitulatif des micro projets achevés et clôturés de la 1^{ère} vague

Régions	Total MP approuvés et financés	Total MP achevés et clôturés	Taux d'achèvement MP (%)
Fatick	60	60	100
Kaolack	54	54	100
Kolda	53	53	100
Louga	104	104	100
Total	271	271	100

1.2 Achèvement et clôture de la deuxième vague des micro projets de services sociaux de base

1.2.1 Rappel :

Lors de la dernière mission de supervision de juillet 2005, l'état d'avancement des micro projets de la deuxième vague se résumait comme suit :

- Sur 254 MP approuvés, 126 étaient achevés et clôturés et
- 128 MP en cours d'exécution sur lesquels, 91 avaient un taux d'exécution de 80%, tandis que les 37 autres se situaient entre 5% et 20% d'avancement.

1.2.2 Etat d'avancement des 128 micro projets de la 2^{ème} vague

A la date du 15 novembre 2005, sur les 128 MP qui étaient en cours d'exécution, 97 sont achevés et clôturés. Les documents d'auto évaluations et de clôture ont été renseignés et sont disponibles. Les 31 MP restants sont à des niveaux d'exécution variant entre 40 et 70 %. (retards dans l'octroi de terrains). Ils seront achevés et clôturés en février 2006.

1.2.3 Mise en œuvre de 53 micro-projets supplémentaires dans les régions de Dakar, Diourbel et Louga

Compte tenu de disponibilité de ressources, 53 nouveaux MP ont été financés sur le lot des MP approuvés et en attente de financement dans les régions de Dakar (36 MP), Diourbel (8 MP) et Louga (9 MP). Le choix des MP a été opéré dans un souci de renforcer les zones à faible densité d'intervention. Ceci porte 578 au lieu de 525 le nombre de microporjets mis en œuvre. Leur achèvement et clôture de l'ensemble de ces MP est prévu au plus tard le 30 mars 06.

1.2.4 Récapitulatif des micro projets des 1^{ère} et 2^{ème} vagues

Au 15 novembre 2005, le cumul de MP achevés et clôturés des vagues 1 et 2 se chiffre à 494 MP, soit un taux d'achèvement de 94 % par rapport à l'objectif initial de 525 MP. Avec les 53 MP supplémentaires financés sur la liste des micro projets qui étaient en attente, le nombre total de MP en cours d'exécution est de 84. La situation d'avancement des MP des 1^{ère} et 2^{ème} vagues ainsi que leurs taux d'exécution sont résumés ci-dessous :

- 1^{ère} vague : 271 MP approuvés, mis en œuvre, achevés et clôturés ;
- 2^{ème} vague : 254 MP approuvés et exécutés parmi lesquels, 223 MP achevés et clôturés et 31 MP exécutés entre 40 et 70%.
- 53 MP supplémentaires issus du lot de 177 MP approuvés et en attente de financement de la 2^{ème} vague. Leur taux d'exécution se situe entre 5 et 35 %.

Le tableau ci-dessous donne la répartition globale de l'état d'exécution des MP des vagues 1 et 2

Régions	Situation MP de la 1 ^{ère} vague		Situation MP de la 2 ^{ère} vague				Nbre total MP achevés et clôturés vagues 1 et 2	Nbre MP supplémentaires financés	Cumul MP en cours exécution	Répartition selon le niveau d'exécution	
	Nbre MP financés	Nbre MP achevés	Nbre MP financés	Nbre MP achevés et clôturés	Nbre MP en cours exécution	40% > Taux<70%				5% > Taux<35%	
Fatick	60	60	82	75	7	135	8	15	7	8	
Kaolack	54	54	32	30	2	84	0	2	2	0	
Kolda	53	53	64	52	12	105	0	12	12	0	
Louga	104	104	59	51	8	155	9	17	8	9	
Dakar	0	0	17	15	2	15	36	38	2	36	
Total	271	271	254	223	31	494	53	84	31	53	

1.2.5 Assistance technique OADC 2^{ème} vague

Sept (7) opérateurs ont été recrutés pour les missions d'appui aux communautés de base couvrant la période de Mai 2004 à octobre 2005, soit une durée de 18 mois. Au 15 novembre 2005, le taux global d'exécution financière de la mission est de 73,7%.


La couverture des villages et quartiers touchés par le projet ainsi que le niveau de décaissement réalisé sont mentionnés dans le tableau ci-dessous.

Département	Nombre villages prévus	Nom Opérateur	Coût mission F CFA	Montant décaissé	Montant restant	Taux d'exécution
LOUGA	60 villages	CECI	103 639 362	51819680	51819682	49,9
KEBEMER	63 villages	SCIEPS	118 000 000	86144680	31855320	73
FOUNDIOUGNE	119 villages	REGROUPEMENT SENAGROSOL/WAAME	144 595 000		18309848	87,4
FATICK				126285152		
GOSSAS	40 villages	PASTEEF	74 555 046		13235821	82,2
DJOURBEL	22 villages			61319225		
KAFFRINE	67 villages	MSA	106 130 000	56676558	49453442	53,4
VELINGARA/ KOLDA	122 villages	SENAGROSOL	146 470 000	133694329	12775671	91,3
RUFISQUE ET PIKINE	67 villages	ENDA ECOPOLE	94 059 750	73939262	20120488	78,6
Total	578 villages et 78 quartiers	7 Opérateurs	787 449 158	589878886	197570272	73,7

1.3 Répartition par secteur des microprojets des vagues 1 et 2

Au total, sur les 578 MP financés depuis mai 2003, 494 micro projets sont actuellement achevés et clôturés, soit un taux global d'achèvement de 94 %. Les 84 micro projets restants sont en cours d'exécution et seront achevés et clôturés avant le 31 mars 2005. La répartition par secteur des MP financés montre la prédominance de l'hydraulique, la santé et l'éducation dans les investissements sociaux réalisés par l'AFDS.

REGION	CUMUL AU 30/06/2005	REPARTITION PAR SECTEUR DES MP						%
		KOLDA	KAOLACK	LOUGA	FATICK	DAKAR	Cumul au 15/11/2005	
Education	109	18	8	55	31	0	112	19%
Santé	137	35	31	32	26	26	150	26%
Socio Economie	75	11	11	23	30	7	82	14%
Hydraulique	149	51	32	36	36	0	155	27%
Socio Culturel	11	1	1	2	8	0	12	2%
Transport	1	0	0	0	1	0	1	0%
NTIC	3	0	0	3	1	0	4	1%
Formation	4	0	2	3	0	20	25	4%
Environnement/Assainissement/Écotourisme	36	1	1	18	17	0	37	6%
TOTAL	525	117	86	172	150	53	578	100%

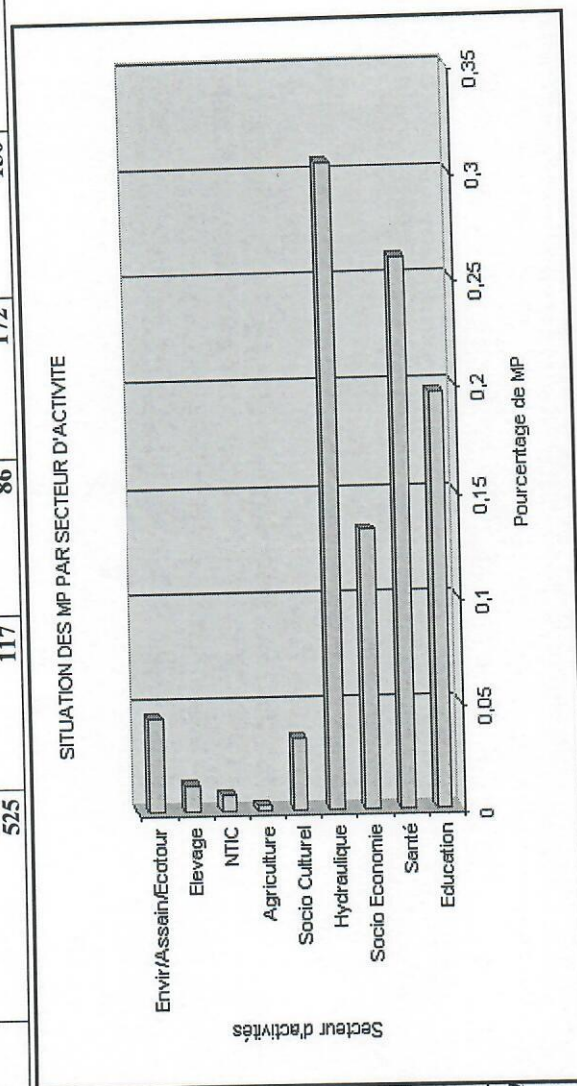

1.4 Formations spécifiques et IEC/SIDA

Rappel : Au 30 juin 2005, tous les micro projets clôturés ont achevé leurs formations y compris les formations en IEC/SIDA. Les formations spécifiques ont touché 5200 personnes dont 70% de femmes et de jeunes. Pour les IEC sur le VIH/SIDA, sur 1886 relais formés, 73% étaient des femmes et des jeunes.

Réalisations : Au 15 novembre 2005, en dehors des régions de Fatick et de Louga qui avaient bouclé les formations, la nouvelle situation se présente comme suit :

- Dans la région de Kaolack, la mise en place et le renforcement des capacités de réseaux a été l'activité majeure dans ce domaine. En effet, deux (2) types de réseaux ont vu le jour. Il s'agit de :

- o Réseau des Comités de Gestion de l'Eau (RECOGE) avec la formation de 10 comités de gestion de puits qui a regroupé 23 participants dont 20 hommes (14 adultes et 6 jeunes) et 3 femmes adultes.
- o Réseau des Comités de Gestion en Santé où 13 participants ont bénéficié de la formation avec 10 hommes (5 adultes et 5 jeunes) et 3 femmes adultes.

La formation sur le VIH/SIDA a touché 116 personnes réparties entre 57 hommes (33 adultes et 24 jeunes) et 59 femmes (32 adultes et 27 jeunes).

- Dans la région de Dakar, les formations techniques spécifiques ont touché 429 personnes dont 153 femmes et 249 jeunes et ont concerné les domaines suivants :

- o Gestion des déchets biomédicaux
- o Hygiène et environnement
- o Techniques de pépinières et plantation
- o Gestion des médicaments
- o Entretien et maintenance
- o Transformation des produits locaux
- o Couture, coiffure et teinture
- o Micro jardinage

La formation sur l'IEC et le VIH/SIDA a regroupé 74 participants dont 40 femmes.

- Dans la région de Kolda, les formations complémentaires ont été menées principalement sur des modules portant sur l'hygiène, la gestion de l'eau et la maintenance des ouvrages hydrauliques ainsi que sur la transformation des produits agricoles locaux. Ces formations ont touché 113 personnes dont 85 hommes (57 jeunes et 28 adultes) et 28 femmes dont 19 jeunes.
- La formation sur l'IEC et le VIH/SIDA a couvert 147 hommes dont 120 jeunes et 67 femmes dont 38 jeunes.

Globalement, le nombre de personnes formées se chiffre à 5635 dont 2236 femmes et 1812 jeunes. Le détail de toutes ces formations figurent en annexe du rapport.

II- EXECUTION FINANCIERE DE LA COMPOSANTE

Au 15 novembre 2005, le cumul global de financement des 578 micro projets approuvés par l'AFDS est de 7 064 997 784 F CFA. Le montant total des virements effectués se chiffre à 5 030 607 456 F CFA, soit un taux de 71 % de décaissement.

Région	Nombre MP approuvés	Coût total financement	Virements	
			Montants virés	Taux décaissement (%)
KOLDA	117	1 225 000 208	859 864 968	70,2
KAOLACK	86	953 804 895	838 490 257	87,9
FATICK	150	1 975 600 838	1 421 989 603	72
LOUGA	172	2 235 200 317	1 694 189 216	75,8
DAKAR	53	675 391 526	216 073 412	32
TOTAL	578	7 064 997 784	5 030 607 456	71

III- EVALUATIONS TECHNIQUES

Trois missions d'évaluations techniques portant sur 234 micro projets achevés et clôturés ont été réalisées dans les quatre régions de Fatick, Kaolack, Kolda et Louga couvertes par l'intervention.

Ces évaluations ont ciblé les secteurs de l'Hydraulique et l'Assainissement pour un lot de 96 MP, de l'Education et la Formation pour un total de 64 MP et de la Santé pour un lot de 74 MP.

Les rapports provisoires de chacune de ces évaluations ont été déposés et ont fait l'objet de commentaires et d'observations de la part de l'AFDS et de l'IDA. Les deuxièmes versions des rapports de l'hydraulique et de la santé ont été envoyées à l'IDA depuis le 20 octobre 2005. La deuxième version du rapport de l'éducation/formation est en finalisation.

Tous ces rapports ont fait l'objet de partage en interne à l'AFDS. En outre, un atelier externe de partage est programmé en décembre 2005.

L'évaluation du degré de respect des règles de gestion environnementale par les projets communautaires et des mécanismes de gestion des risques environnementaux est prise en charge par l'étude environnementale réalisée dans le cadre de la préparation du Programme National de Développement Local Participatif (PNDL).

IV ACTIVITES DE CAPITALISATION

3.1 Cartographie des réalisations

Cette activité menée en collaboration avec le Centre de Suivi Ecologique est achevée au 31 juillet 2005. Chaque collectivité locale d'intervention de l'AFDS dispose d'un lot de cinq (5) cartes sauf les régions de Dakar et de Ziguinchor ainsi que les communautés rurales de Diourbel et Ranérou (Matam). Un avenant sera signé avec le consultant pour la réalisation de ces cartes.

3.2 Production de Guides illustrés pour l'entretien et la maintenance des infrastructures

L'AFDS a produit des Guides d'Entretien et de Maintenance d'infrastructures et d'équipements dans les secteurs de la santé, de l'hydraulique, de l'éducation et de la socio économie (magasins de stockage). Un Guide est disponible pour chaque secteur suscité. Un atelier de partage et de validation sera organisé au courant du mois de février 2006.

3.3 Production de Guides illustrés pour la réalisation des EPP/EPB

L'AFDS a entrepris la production d'un guide de réalisation des Evaluations Participatives de la Pauvreté et des Evaluations Participatives des Besoins. Au 15 novembre 2005, le guide est à l'étape de finalisation. Ce guide sera partagé et validé par l'atelier de capitalisation.

IV MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DANS LA REGION DE ZIGUINCHOR

4.1 Réalisation des EPP/EPB

Les Evaluations Participatives de la Pauvreté et les Evaluations Participatives des Besoins (EPP/EPB) ont été réalisées sur 72 villages et 15 quartiers ciblés. Chaque village et quartier dispose d'un rapport d'EPP/EPB.

4.2 Préparation, formulation des MP

Les trois (3) Comités Techniques d'Evaluation départementaux ont organisé chacun deux (2) sessions d'évaluation des Demandes de Micro Projets (DMP) respectivement au courant des mois d'août et octobre 2005.

Au total, sur 84 DMP évaluées, 75 DMP sont classés dans la catégorie A, 3 rejetés dans la catégorie B et 6 en C, donc à reformuler. Les rapports d'évaluation ainsi que les DMPsont transmis au siège de l'AFDS. Le coût moyen d'un MP à Ziguinchor est de 10215390 F CFA. Le coût moyen initialement fixé par l'Accord du Don Japonais est de 20 000 \$.

La répartition des micro projets par session de CTE est la suivante :

Départements	CTE1					CTE2de					Montant total subvention
	Nombre DMP reçues	Classement MP			Montant subvention	Nombre DMP reçues	Classement MP			Montant subvention	
		Catégorie A	Catégorie B	Catégorie C			Catégorie A	Catégorie B	Catégorie C		
	16	8	3		5	24	0	0	266328466	365013829	
Ziguinchor	17	17	0		0	16	0	0	168757728	375536261	
Bignona	7	6	0		1	4	0	0	47061456	117542640	
Oussouye	40	31	3		6	44	0	0	482147650	858092730	
Total											

4.3 Mise en œuvre des MP

Sur les 84 MP approuvés, 31 ont reçu leurs premiers virements. 12 maîtres d'œuvre sont recrutés et les DAO sont lancés depuis le 14 novembre 2005. Le démarrage des 44 autres MP est programmé en début décembre 2005.

Toutes les formations sur le peace building, la passation des marchés et l'organisation et la dynamique communautaire sont réalisées.

V PERSPECTIVES - MARS 2006

Le suivi de la mise en œuvre et l'achèvement des 84 micro projets restants en vue de leur clôture avant le 31 mars 2006 ;
La réalisation de l'évaluation d'impact des financements du projet FDS sur l'exécution des Plans Locaux Développement.

La réalisation de l'évaluation du degré de connaissances des communautés du VIH/SIDA

La réalisation de l'évaluation des performances des OADC 2ème vague

La poursuite des activités de capitalisation des EPP/EPB et du processus d'appui du projet aux communautés de base;

L'organisation d'un atelier de restitution des trois évaluations techniques ex-post des micro projets achevés des secteurs de l'Hydraulique et de l'Assainissement, de la Santé et de l'Education ;

La mise en œuvre, le suivi et l'évaluation, la pérennisation de 75 MP approuvés de la région de Ziguinchor ;

Le suivi de l'achèvement et de la clôture des 75 MP financés.

ANNEXES

ANNEXE 1 : PLAN D'ACTIONS COMPOSANTE 1 : "AMELIORATION DE L'ACCES AUX INFRASTRUCTURES ET SERVICES SOCIAUX DE BASE"

N°	ACTIVITES	INDICATEURS	Date d'achèvement prévisionnel	2005		2006					
				Nov	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin
1	Recrutement Assistance technique										
	Consultants pour évaluation technique des Microprojets achevés	1 rapport d'évaluation du volet éducation disponible	31/11/2005								
	Consultants pour l'évaluation des performances des OADC		31/janv/2006								
	Sélection de consultants	3 CV sélectionnés et 1 contrat signé									
	Exécution mission	1 rapport d'évaluation disponible									
	Consultant pour l'élaboration du guide sur les EPP	TDR validés	31 nov 05								
	Production du guide d'EPP/EPB	1 guide disponible									
	Consultant pour la production d'un Guide illustré pour la réalisation d'infrastructures, l'entretien et la maintenance	1 guide illustré disponible pour les secteurs de la santé, éducation, hydraulique et socio économie	15-déc-05								
2	Capitalisation des Evaluations Participatives de la Pauvreté (EPP)										
	Organisation de séminaires de restitution des résultats des EPP	TDR ateliers élaborés, liste participants connus et rapport atelier disponible	28 fév 06								
	Mise à disposition des rapports aux autorités locales		15 mars 06								

ANNEXE 2 : ETAT D'EXECUTION DES ACTIVITES DE LA COMPOSANTE 1 AU 15 NOVEMBRE 2005

N°	ACTIVITES	INDICATEURS	ETAT D'EXECUTION	OBSERVATIONS
1.1	Recrutement Assistance technique			
	<i>Consultants pour évaluation technique des MP achevés</i>			
	Elaboration des TDR consultants pour évaluation technique des MP	TDR validés	Réalisé	Dans le cadre de la formulation du PNDL, l'étude du volet environnemental et social a pris en charge l'évaluation du degré de respect des règles de gestion
	Evaluation des CV des consultants	Au moins 12 CV évalués	Réalisé	environnementale par les projets communautaires et des mécanismes de gestion des risques environnementaux
	Recrutement de 4 Consultants	4 contrats signés	3 Etudes réalisées pour les secteurs santé, hydraulique, et éducation	Le rapport du secteur éducation a fait l'objet d'un partage en interne 14 novembre 05; il est en finalisation
	Exécution de la mission	Rapports d'évaluation de MP	Réalisé. Les rapports sont disponibles pour les secteurs santé et hydraulique. Ces rapports qui ont fait l'objet d'observations et de commentaires de la part de l'IDA lors de la dernière mission de supervision ont été aussi partagés en interne. Les deuxièmes versions ont été envoyées depuis 20 octobre 2005	
	Consultants pour l'évaluation des performances des OADC			
	Elaboration des TDR des Consultants	TDR validés	Réalisé	
	Evaluation des CV des consultants	Au moins 6 CV évalués	Processus de recrutement des consultants en cours	
	Recrutement de 2 Consultants	2 contrats signés		
	Exécution de la mission	2 rapports d'évaluation des OADC disponibles		La mission sera réalisée au plus tard 31 janvier 06
	Consultant pour l'élaboration du Guide méthodologique sur les EPP			
	Elaboration des TDR du consultant		Réalisé	Le guide est disponible
	Evaluation des CV des consultants			

	Recrutement du Consultant	1 contrat signé			
	Exécution de la mission	1 guide disponible			
	Consultant pour la production d'un Guide illustré pour la réalisation d'infrastructures, l'entretien et la maintenance				
	Elaboration des TDR du Consultant	TDR validés	Réalisé		Les guides sont disponibles pour les infrastructures dans les secteurs de l'éducation, la santé, l'hydraulique et la socio économie
	Evaluation des CV des consultants	Au moins 3 CV évalués			
	Recrutement du Consultant	1 contrat signé			
	Confection du Guide illustré	Guides illustrés réalisés			
1.2	Capitalisation des Evaluations Participatives de la Pauvreté (EPP)				
	Organisation de séminaires de restitution des résultats et partage de la méthodologie	1 séminaire national et 5 séminaires régionaux organisés	Les TDR des ateliers élaborés sont disponibles		Les restitutions sont programmées au plus tard 28 février 2006
	Mise à disposition des rapports aux autorités locales	1032 rapports villages/quartiers et 57 rapports CR mis à disposition	Réalisé pour la région de Fatick depuis septembre 04.		Les rapports seront transmis aux autorités des autres régions (Gouvernances et Conseils régionaux) au plus tard 15 mars 06
1.3	Poursuite activités 1ère vague OADC dans 276 villages / Quartiers				
	Clôture des MP 1ère vague	271 MP clôturés avant le 31 mars 2005	Réalisé en août 05		Les 271 MP sont achevés et clôturés. Les 4 MP résiliés de Louga ont été remplacés au profit d'OCB du département de Kébémér, même région
	Suivi du fonctionnement des infrastructures	Toutes les infrastructures sont fonctionnelles	Toutes les 271 infrastructures/équipements sont fonctionnelles		
1.4	Poursuite activités 2ème vague OADC dans 578 villages / Quartiers				
	Suivi exécution 254 MP approuvés	254 MP exécutés	Sur les 254 MP, 223 sont achevés et clôturés au 15 novembre 05, soit 97 MP clôturés suite à la dernière supervision de juillet 05		Les 31 MP restants sont exécutés entre 40 et 70 %. Leur achèvement et leur clôture sont prévus le 28 février 06
	Clôture des 254 MP	254 MP achevés et clôturés			
	Formation des CTMO en entretien et maintenance des infrastructures	10 ateliers de formation organisés/150 personnes formées	Réalisé, 11 ateliers formation organisés et 168 personnes formées à raison de 2/CTMO		Les formations en entretien en maintenance se poursuivent pour les autres MP en cours

1.4 bis	Mise en œuvre des 53 micro-projets supplémentaires dans les régions de Dakar, Diourbel et Louga * 1			
	Lancement MP			
	Versement 1ère tranche de financement des micro-projets	Montant versé par MP		
	Exécution des micro-projets	53 réalisés dans les délais		
	Versement des autres tranches de financement	Montant versé par MP		
	Auto-évaluation des MP	53 auto-évaluations réalisées		
	Clôture des MP	53 assemblées de clôture de MP organisées		
1.5	Suivi /supervision de la mise en œuvre de la composante			
	Organisation de missions de supervision	1 mission de suivi par MP réalisée par les ARFS, 1 mission de supervision réalisée par l'UACB par trimestre	2 missions de supervision ont été réalisées par le responsable de la composante. Un suivi régulier a été assuré par les Antennes au niveau des régions	Rapports de mission disponibles
	Organisation de visite de partage avec les secteurs	Nombre de missions organisées	Réalisé dans les régions de Kaolack avec l'Hydraulique et la santé, à Kolda avec l'Hydraulique, la Santé et l'Education et à Louga avec l'Hydraulique, l'Education, la Santé et l'Environnement.	L'activité se poursuivra dans les régions de Fatick et Dakar
1.6	Activités d'information communication et de capitalisation			
	Organisation de 3 ateliers de capitalisation avec les acteurs (CTE, OADC, communautés, prestataires)	3 ateliers de partage organisés	Réalisé dans les régions de Kaolack, Louga avec les prestataires, les communautés et les OADC	Cette activité se poursuivra dans les autres régions jusqu'au 26 mars 06
	Visites d'échanges entre communautés	10 de visites d'échanges organisées	4 visites réalisées par les Antennes régionales	Echéance au 30 janvier 06
	Partage des évaluations ex-post	3 ateliers de partage organisés	3 restitutions en interne ont été tenues	les ateliers avec les sectoriels sont prévus avant 31 décembre 05

	Restitution des études sur l'élaboration de guides pratiques sur les infrastructures	6 restitutions réalisées	Une restitution interne au niveau du siège a été effectuée	Les autres restitutions avec le secteur fixées au plus tard 30 décembre 05
1.7	Mise en œuvre des activités de la région de Ziguinchor*2		Réalisé	72 villages et 15 quartiers ont été ciblés
	Ciblage de 100 villages/quartiers éligibles	100 villages/quartiers retenus conformément aux critères		
	Recrutement de 2 Opérateurs	2 opérateurs recrutés	3 Superviseurs et 11 animateurs ont été recrutés pour accompagner les communautés ciblées	Toute l'équipe d'intervention a été mise à niveau sur l'approche et les stratégies du PFDS
	Réalisation des Evaluations Participatives de la Pauvreté (EPP) et des Evaluations Participatives des Besoins (EPB) et préparation des Demandes de MP	100 EPP/EPB réalisées et rapports disponibles	Les EPB ont été réalisées dans les 87 villages/quartiers ciblés. Un rapport d'EPP/EPB est disponible par village	Toute l'équipe d'intervention a été mise à niveau sur les EPP/EPB, la FGB et le Peace building. Un rapport sur la mise à niveau est disponible
	Mise en place des organes de gestion des MP	CGMP, CTMO et CAF installés par MP	Pour chaque MP, un CGMP, un CTMO et un CAF ont été installés et sont fonctionnels	Toutes les formations en FGB et peace building ont été réalisées au profit des OCB, Un rapport de formation est disponible
	Mise en place du comité technique d'évaluation (CTE)	1 session de formation	Les 3 CTE des départements de Oussouye, Ziguinchor et Bignona ont été créés par arrêté préfectoral et installés respectivement les 21, 22 et 23 juin 05, Les rapports de mise à niveau de ces CTE sont disponibles	Ce changement d'approche a pour objet une meilleure implication des sectoriels et des collectivités locales pour une meilleure décentralisation des prises de décisions lors des évaluations des DMP
	Organisation des sessions d'évaluation des DMP par les CTE	2 sessions d'évaluation organisées	2 sessions de CTE ont été organisées par départemental. Pour Oussouye, du 9 au 11 août 05 et du 13 au 15 octobre 05; Pour Ziguinchor, du 11 au 13 août 05 et du 21 au 26 octobre 05 et enfin pour Bignona, du 25 au 27 août 05 et du 25 au 28 octobre 05.	1 rapport d'évaluation est disponible par session de CTE départemental

	Transmission des DMP et des rapports du CTE à la Direction Générale de l'AFDS	70 DMP évaluées	84 DMP sont évaluées sur 70 initialement prévues. 75 MP sont classés dans la catégorie A, 3 rejetés (Catégorie B) et 6 à reformuler (Catégorie C).	75 MP sont approuvés. Les rapports d'évaluation ainsi que les DMP sont disponibles au siège de l'AFDS
	Approbation des DMP	70 MP approuvées		
	Virement des tranches	2 tranches virées par MP	31 MP approuvés lors du CTE1 ont reçu leurs premières tranches de virement.	Le financement des 44 autres MP est prévu en début décembre 05
	Mise en œuvre des MP	70 MP exécutés et suivis	Les DAO des 31 premiers MP sont lancés depuis 14 novembre 05	12 maîtres d'œuvre ont signé leurs contrats
	Auto-évaluation des MP	75 MP auto évalués	Non réalisé	28-févr-06
	Clôture des MP	75 assemblées générales de clôture organisées	Non réalisé	15-mars-06
NB:	(*1) : Le financement des 53 nouveaux MP a été obtenu grâce aux ressources mobilisées issues de la révision des calculs des DRF (taux de change sur le crédit du PFDS). Ce financement privilégie les régions de Dakar, Diourbel et Louga pour assurer un équilibre des investissements			
	(*2) : Le financement des MP de la région de Ziguinchor a été obtenu grâce aux dons japonais			

ANNEXE 3 : Récapitulatif des Formations spécifiques réalisées par région et par secteur

<u>Régions</u>	<u>Secteurs</u>	<u>Type_Formation</u>	<u>Participants</u>				<u>Observations</u>
			<u>F</u>	<u>H</u>	<u>J</u>	<u>Total</u>	
<u>Kaolack</u>	santé	Formation des Matrones et ASC	40	06	10	56	Il faut mentionner en plus les 08 relais communautaires en Santé formés par le district de Kounghoul
		Entretien / Maintenance	48	34	30	112	
		Formation IB	16	22	10	48	
	Education	Hygiène / Environnement	09	05	07	21	
		Entretien / Maintenance des infrastructures scolaires	14	17	04	35	
		Formation Gestion points d'eau	32	21	13	65	
	Hydraulique	Entretien / Maintenance des points d'eau et hygiène	18	23	20	61	Ce sont les mêmes personnes qui ont participé au module commun sur l'hygiène, l'entretien et la maintenance d'un point d'eau
		Formation Gestion, Entretien et maintenance	13	18	09	40	
	Socio-économique Formations thématiques	Techniques de Stockage des produits agricoles et pesticides	09	14	05	28	La formation en gestion et en entretien s'est faite dans le même module selon le type de MP. Les OCB ayant des magasins ont été par contre les seules à traiter les techniques de stockage
		Formation Thématique pour pré réseau Hydraulique	03	14	06	23	
		Formation Thématique pour pré réseau Santé	03	05	05	13	
<u>Kolda</u>	IEC Sida	Formation et sensibilisation sur l'IEC/SIDA	86	127	50	263	Cette formation concerne tous les MP
	TOTAL		291	306	169	766	766 personnes formées dont 263 sur l'IEC/SIDA
	Santé	Formation des Matrones	30	00	00	30	PCIME = Prise en charge intégrée des maladies de l'enfant
		Formation des ASC	00	7	8	15	
		Entretien / Maintenance	12	35	40	87	
		PCIME	16	16	71	103	
	Education/Formation	Hygiène / Environnement	28	21	34	83	
		Entretien / Maintenance	10	15	00	25	
		Couture	00	02	02	04	
		Teinture	00	03	01	03	
		Electricité	00	00	02	02	
		Transformation de produits locaux	00	01	00	01	

	Hydraulique	Formation Gestion points d'eau Entretien / Maintenance	11	02	12	25	Cette formation concerne les relais
		Hygiène	11	02	12	25	
		Formation Gestion	8	21	09	30	
		Techniques de Stockage et entretien	6	22	12	40	
	Socio-économique IEC/Sida	Formation et sensibilisation sur l'IEC/SIDA	136	71	131	338	
Fatick	TOTAL		279	220	346	845	845 personnes formées dont 338 sur l'IEC/SIDA
	Santé	Formation des Matrones et ASC	30	00	00	30	
		Entretien / Maintenance	8	23	19	34	
		IEC / SIDA	64	34	40	138	
		Formation IB	12	16	12	40	
		Hygiène / Environnement	58	108	25	191	
	Education	Entretien / Maintenance	20	23	18	61	
		Formation Gestion points d'eau	35	59	42	136	
		Entretien / Maintenance et Hygiène	35	59	42	136	
	Hydraulique	Formation Gestion	40	86	52	178	
	Socio-économique	Entretien	16	86	40	142	Cette formation ne concerne que les relais Sida
		Techniques de Stockage produits agricoles et pesticides	238	168	180	586	
	IEC/Sida	Formation et sensibilisation sur l'IEC/SIDA	556	594	470	1620	
	TOTAL		16	02	02	20	
	Santé	IEC sur les Maladies Hydriques	14	07	06	27	
		Techniques de Foresterie	27	48	89	164	
		Entretien de Maintenance des équipements infrastructures	00	07	00	07	
		Formations ASC	22	00	00	22	
		Formation Matrones	256	104	113	473	
	Education	Organisation fonctionnement de l'APE	6	6	16	28	
		Techniques de Foresterie	64	34	56	154	
		IEC sur les Maladies Hydriques					

Loug	Hydraulique et assainissement	Techniques de foresterie		6	10	2	18	Cette formation ne concerne que les relais SIDA
		IEC sur les maladies du péril fécal	Entretien de Maintenance des équipements infrastructures	105	33	36	174	
				8	8	1	17	
		Techniques de gestion et de conservation produits agricoles et pesticides		78	39	39	156	
		Formation d'auxiliaires vétérinaires		0	06	8	14	
	IEC/Sida	Formation et sensibilisation sur l'IEC/SIDA		353	136	210	699	
	TOTAL			957	440	578	1975	1975 personnes formées dont 699 sur l'IEC/SIDA
Dakar	Santé	Gestion déchets bios médicaux		19	27	21	46	
		Environnement et hygiène		11	21	42	74	
		Techniques de pépinières et plantation		5	5	6	10	
		Gestion des médicaments		18	12	17	30	
		Entretien et maintenance		4	16	11	20	
	Education et Formation	IEC sur VIH/SIDA		20	17	36	37	
		Environnement et hygiène		11	21	42	74	
		Techniques de pépinières et plantation		5	5	6	10	
		Entretien et maintenance		4	16	11	20	
		Couture		4	0	0	4	
TOTAL REGIONS	IEC/SIDA Formations spécifiques	Coiffure		4	0	0	4	
		Micro jardinage		10	0	4	10	
		Transformation des produits locaux		10	0	10	45	
		Teinture		8	0	7	8	
		IEC sur VIH/SIDA		20	17	36	37	
	TOTAL			153	157	249	429	429 personnes formées dont 74 sur l'IEC/SIDA dans la région de Dakar
				853	536	643	1960	
				2236	1717	1812	5635	
