

% D'EXECUTION PHYSIQUE

<u>Catégories</u>	<u>Taux</u>	<u>Composantes</u>	<u>Taux</u>
Etudes et supervision	12%	Renforcement des capacités	24%
Construction/Réhabilitation	15%	Microfinance et AGR	18%
Equipements/Mobilier/Fournitures	12%	Infrastructures/Equipements/Hydraulique	22%
Services de spécialistes	22%	Gestion du projet	46%
Formation	23%	Total Pourcentage	24%
Fonds de crédit	4%		
Fonctionnement	21%		
Audit	0,4%		
Total Pourcentage	24%		

49

% D'EXECUTION FINANCIERE

<u>COMPOSANTE</u>	<u>BUDGET</u>	<u>MONTANT DEPENSE 2001- 2002</u>	<u>NIVEAU</u>
RENFORCEMENT CAPACITES	3 994 959 380	329 745 180	8%
MICROFINANCE ET AGR	3 695 777 400	26 565 320	1%
IEH	7 092 372 820	139 354 613	2%
GESTION	1 583 904 600	990 567 563	63%
TOTAL	16 367 014 200	1 486 232 676	9%

50

CALENDRIER DES DECAISEMENTS

COMPOSANTES	1 999	2 000	2 001	2 002	2 003	2 004	TOTAL
RENFORCEMENT DES CAPACITES DES BENEFICIAIRES ET PARTENAIRES			105	225	1 211	2 454	3 995
MICROFINANCE ET AGR				27	2 202	1 467	3 696
INFRASTRUCTURES, EQUIPEMENTS ET HYDRAULIQUE				139	4 195	2 758	7 092
GESTION			449	542	280	313	1 584
TOTAL			554	933	7888	6992	16 367

51

REGION DE DAKAR

Nom de l'ONG (Sigle)	Zones d'intervention	Langues d'intervention
ACAPES	Parcelles Assainies	Wolof - Pulaar
EELS	Yeumbeul- Thiaroye - Pikine	Pulaar - Wolof Sereer
ADES	Yeumbeul - Pikine	Pulaar
ADIS	Guédiawaye	Wolof - Pulaar
CEREM	Pikine Guinaw rail	Mandinka
LAYIF	Dakar - Diourbel - Thiès	Wolof
SAFINA	Gd Yoff Scat Urbam	Wolof - Pulaar
TOSTAN	Dakar - Thiès	Wolof

REGION DE THIES

Nom de l'Organisation (Sigle)	Zones d'intervention	Langues d'intervention
MAISONS FAMILIALES RURALES	Thiès - Tivaouane - Mbour	Wolof - Sereer
ANAFI	Thiès	Wolof
OIEC	Thiès - Mbour	Wolof - Sereer
LAYIF	Thiès - Mbour	Wolof
ARP / THIES	Thiès - Tivaouane - Mbour	Pulaar
ADIS	Thiès	Wolof - Sereer
ASDEC	Thiès	Wolof - Sereer
AFLN	Thiès	Wolof - Sereer

REGION DE DIOURBEL

Nom de l'Organisation (Sigle)	Zones d'intervention	Langues d'intervention
CARITAS	BAMBEY	Wolof - Sereer
AHDIS	BAMBEY - DIOURBEL - MBACKE	Wolof
ALPHA 2000	BAMBEY	Wolof - Sereer
GROCEF	TOUBA - MBACKE	Wolof
ARP / DIOURBEL	DIOURBEL	Pulaar
ADIS	DIOURBEL	Wolof - Sereer
JID	MBACKE	Wolof - Sereer
UGROPAD	DIOUBEL - MBACKE	Wolof - Sereer

REGION DE TAMBACOUNDA

Nom de l'Organisation (Sigle)	Zones d'intervention	Langues d'intervention
ACUPROS	TAMBACOUNDA	Mandinka - Soninke Wolof
SODEFITEX	TAMBACOUNDA	Pulaar
ENVIRONNEMENT 2001	TAMBACOUNDA GOUDIRY	Pulaar
GRADIL	BAKEL	Soninke - Pulaar - Mandinka
GRACE	TAMBACOUNDA	Pulaar - Mandinka
CADRE	TERRES NEUVES	Mandinka - Wolof - Sereer
CEREM	TAMBA / MAKACOULI BANTA	Mandinka
ASSOCIATION ABK	BAKEL	Pulaar

REGION DE KOLDA

Nom de l'Organisation (Sigle)	Zones d'intervention	Langues d'intervention
OFAD / NAFOORE	Dépt. de Kolda, Vélingara et Sédhiou CR : Dabo et Dianaba	Pulaar - Mandinka
FORM'ACTION	Dépt. de Kolda et de sédhiou	Pulaar
ADECK	Dépt. de Vélingara CR Kounkane - Diaobe	Pulaar
CADRE	CR Tanaf Bounkiling Dépt. De Sédhiou	Mandinka
CEREM	CR. Diatacounda Dépt. De Sédhiou	Mandinka
CPEF	Dépt. De Kolda	Pulaar
ACUPROS	Dépt. De Vélingara	Sereer - Wolof - Soninke
SODEFITEX	Dépt. De Kolda et de Vélingara dans toutes les CR	Pulaar

**Recrutement d'un bureau de communication :
Contrat signé, Processus d'approbation
nationale en cours**

**Mise en œuvre du Plan de communication
(Edition plaquettes, calendrier 2003 et
supports secondaires)**

**Plan de formation global réalisé en avril 2002
et en cours de mise en œuvre**

**Sous composante : Renforcement
des capacités des partenaires**

Réalisation de l'étude du milieu avec la DPS dans le cadre d'un protocole d'accord : Ciblage des CB les plus pauvres

Réalisation du Diagnostic des besoins des ONG en appui institutionnel et en formation

Formation du Personnel du Projet en Approche Genre et en méthodes participatives et initiation à la transcription en langues nationales

Remise effective de véhicules, équipements et fournitures de bureau aux partenaires ciblés par le rapport d'évaluation : DPS, CERP, DSDS, CSOPLP, DDC

**COMPOSANTE
MICROFINANCE
ET AGR**

Quatre (04) études ont été réalisées pour affiner la stratégie d'intervention du Projet :

- 1. Etude sur les créneaux porteurs**
- 2. Diagnostic des structures de caisse de base**
- 3. Diagnostic des structures de financement décentralisé (SFD)**
- 4. Etude sur la conception de systèmes de micro finance adaptés aux pauvres**

Acquisition des équipements pour les structures de caisses de base : coffres, mobilier et documents de gestion (Processus en cours)

Recrutement de 15 ONG en charge de l'encadrement technique des bénéficiaires et signature de protocoles d'accord avec elles. Un atelier de mise à niveau a réuni les ONG, CERP, SFD et URG en octobre 2002.

Signature d'un protocole d'accord avec la cellule AT/CPEC pour le suivi - évaluation des activités de micro finance et d'AGR

Conventions avec les SFD signées après Avis de la BAD.

Réalisation d'une mission préparatoire au démarrage des activités des partenaires sur le terrain

Recrutement de Bureaux d'études chargés du renforcement des capacités des partenaires du Projet

Répartition des ONG/OCB selon leurs zones d'intervention

REGION DE DAKAR	ONG / OCB	Structures Financières Décentralisées
Département de Dakar	AJED	PAMECAS FDEA Réseau des Femmes de Gd Yoff
Département de Pikine	CONACAP	PAMECAS ASACASE FDEA Réseau des Femmes de Gd Yoff
Département de Rufisque	AJED	PAMECAS Réseau des Femmes de Gd Yoff
REGION DE THIES		
Département de Thies	GREEN - Sénégal	CMS UNACOIS
Département de Mbour	ANMFR	CMS UNACOIS
Département de Tivaouane	ACA	CMS FDEA
REGION DIOURBEL		
Département de Diourbel	APDJ EGA / DL	ACEP ASACASE
Département de Bambey	AHDIS APCP	AHDIS ASACASE
Département de Mbacké	CESAO PASTEET	ASACASE ACEP

Répartition des ONG/OCB selon leurs zones d'intervention

REGION DE TAMBA		
Département de tamba	AFRICARE	ACEP CMS UNACOIS
Département de Kédougou	AVPK	ACEP CMS
Département de Bakel	AFRICARE	ACEP CMS
REGION DE KOLDA		
Département de Kolda	ACTIONS PLUS	ASACASE UNACOIS
Département de sédhiou	SAHEL 3000	UMEC ACEP
Département de Vélingara	ACTIONS PLUS	CMS UNACOIS

COMPOSANTE

Infrastructures

Equipements

et Hydraulique



Sous-composante : Infrastructures et équipements socio-communautaires

L'AGETIP a été recruté en qualité de MOD

Le bureau MDT Architecture a été recruté par l'AGETIP pour réaliser les études d'orientations relatives aux infrastructures à construire :

L'étude a fait l'état des lieux des réalisations antérieures afin de consolider les acquis positifs et a permis d'élaborer :

- l'ensemble des plans architecturaux et techniques relatifs aux infrastructures,
- les devis quantitatifs et estimatifs des travaux,
- le Dossier d'Appel d'Offres

Réalisation de complexes ou modules autonomes

Du point de vue architectural, les différentes infrastructures (Case foyer, case des tout-petits, case de santé) ont été regroupées chaque fois que la convergence des besoins le justifiait.

Chaque complexe constitue un ensemble de 3 modules autonomes du point de vue fonctionnel, articulés autour d'une salle polyvalente.

Ce concept permettra de fédérer, autour d'un même espace, différents groupes sociaux (femmes, jeunes, enfants, etc.); d'optimiser les coûts et de réduire les contraintes liées à l'acquisition des terrains

Acquisition des équipements d'allègement (broyeurs, batteuses, décortiqueuses, charrettes) : Appel d'offres international lancé en Décembre 2002

Sous-composante : Hydraulique villageoise

Le Groupement de Bureaux d'études Nordique et Sénégalais (COWI/AISB) a été recruté en date du 20 Août 2002 pour réaliser :

les études techniques complémentaires, l'élaboration des cahiers de charge et dossiers d'appel d'offres des travaux d'hydraulique,

l'appui à l'évaluation des entreprises soumissionnaires, la supervision et le contrôle des travaux hydrauliques,

l'élaboration des spécifications techniques des équipements d'exhaure, la sélection des fournisseurs nordiques pour l'acquisition des pompes, en rapport avec le Projet,

la formulation des programmes d'accompagnement (formation, organisation, sensibilisation)

Les études techniques complémentaires ont démarré le 7 novembre 2002

Une liste restreinte d'entreprises qualifiées dans le domaine de travaux hydrauliques a déjà été arrêtée. Les travaux envisagés comportent des ouvrages de :

- **CAPTAGE** (type puits),
- **STOCKAGE et DISTRIBUTION** (réservoirs et bornes-fontaines),
- **ASSAINISSEMENT** (type latrines)

Les travaux ne pourront démarrer qu'après les études techniques préalables

Acquisition des équipements d'exhaure :

- **Mission d'identification** déjà réalisée au Ghana par le Projet en avril 2002

Ces acquisitions seront envisagées dès le démarrage des travaux hydrauliques

COMPOSANTE

GESTION

Recrutement du personnel du BGP et des URG en juin et Septembre 2000

- Directrice en Juin 2000 ;
- Spécialistes de composante, Coordonnateurs, Assistants et personnel de soutien en Septembre 2000 ;
- Administrateur et Comptable en Mars 2002

Mise à disposition des locaux du BGP et des URG de Diourbel et Thiès par l'Etat

Prise en charge sur les fonds de la Contrepartie des charges locatives des URG de Tambacounda et Kolda

Réhabilitation de ces locaux sous la supervision de l'AGETIP dans le cadre de la convention signée

Acquisition des équipements faite auprès de IAPSO : véhicules, matériels informatiques, de reprographie et de bureau, finalisée en juin 02

Elaboration du plan d'exécution détaillé

Recrutement d'une société de nettoyage en décembre 2001

Recrutement d'un consultant en passation des marchés en avril 2002 :

- Plan global de Passation des marchés élaboré et en cours d'exécution

Recrutement d'une société de gardiennage en août 2002

Acquisition du mobilier de bureau du BGP et des URG bouclée en septembre 2002

Réalisation de missions de sensibilisation et d'information sur la stratégie du Projet :

- Dans les 5 régions d'intervention (CRD, CDD) par le BGP
- Dans les communautés de base par les URG en rapport avec les CERP et les ONG

Réalisation de l'étude du milieu :

- La DPS a réalisé le ciblage des 800 Communautés de base constituant l'échantillon de l'étude
- Un cabinet a été recruté pour procéder au diagnostic participatif et procéder au classement des CB les plus pauvres de nos zones d'intervention ;
- Des ateliers de validation régionale et nationale ont été organisés dans le courant du mois de mai 2002;
- Ces ateliers ont vu la participation des populations, services techniques déconcentrés et autorités locales.

Elaboration du manuel des opérations et procédures administratives et financières :

- Validation interne : deux ateliers successifs se sont tenus en juillet et août 02 pour étudier le document provisoire ;
- La Validation Nationale du manuel organisée en août 2002 a vu la participation de tous les partenaires institutionnels et d'exécution du projet et a permis de préciser les attentes du Projet, les rôles et responsabilités des différents acteurs et de partager les informations pour un système de suivi/évaluation performant.

Prise d'arrêtés et installation des Comités de Pilotage :

- Comités Communaux de Pilotage (CCP) ;
- Comités Inter-Communaux de Pilotage (CICP);
- Comités Locaux de Pilotage (CLP) ;
- Tenue de la 1ère réunion du Comité National de Pilotage en Janvier 2003

Acquisition des fournitures et consommables

Coordination et Suivi financier et technique des réalisations du Projet

- Réunions sectorielles ;
- Réunions de coordination du BGP ;
- Réunions de coordination décentralisée ;
- Réunions de coordination avec le Cabinet ;
- Séance de travail avec les partenaires institutionnels et d'exécution ;
- Réunions avec les autres partenaires (Projets, Institutions) ;
- Production des rapports d'activités.

REALISATIONS ATTENDUES

600 Communautés de base touchées dans les 5 Régions ciblées

Alphabétisation fonctionnelle de 36 000 bénéficiaires par 600 facilitateurs (trices)

36 000 bénéficiaires sensibilisés (es) à divers thèmes (santé, planification et gestion de micro projet, démocratie, droits des femmes...)

290 000 micro-crédits accordés

29

2 400 prêts alloués aux caisses d'épargne et de crédit :

1 800 Responsables de groupements formés (es) à divers thèmes (utilisation du crédit, gestion financière, commercialisation, marketing ...)


600 infrastructures et équipements

communautaires mis en place (cases foyers, garderies, banques de céréales, points d'eau équipés de pompe, moulins, équipements de séchage de légumes et poissons...)

3 000 responsables des groupements formés (es) aux techniques de mise en place et de gestion des caisses villageoises d'épargne et de crédit

1 800 représentants (es) des bénéficiaires formés (es) à la gestion et à l'entretien durable des équipements mis en place par le PLCP

Des ONG, SFD et autres partenaires bénéficieront des activités de renforcement de capacités

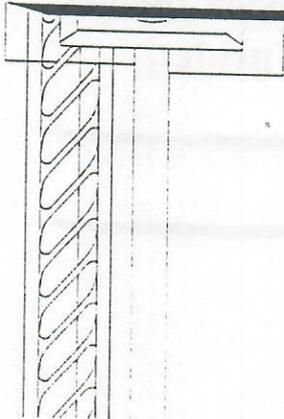

ALPHABETISATION DES BENEFICIAIRES

REGION DE KOLDA

Nom de l'Organisation (Sigle)	Zones d'intervention	Langues d'intervention
OFAD / NAFOORE	Dépt. de Kolda, Vélingara et Sédhiou CR : Dabo et Dianaba	Pulaar - Mandinka
FORM'ACTION	Dépt. de Kolda et de sédhiou	Pulaar
ADECK	Dépt. de Vélingara CR Kounkane - Diaobe	Pulaar
CADRE	CR Tanaf Bounkiling Dépt. De Sédhiou	Mandinka
CEREM	CR. Diatacounda Dépt. De Sédhiou	Mandinka
CPEF	Dépt. De Kolda	Pulaar
ACUPROS	Dépt. De Vélingara	Sereer - Wolof - Soninke
SODEFITEX	Dépt. De Kolda et de Vélingara dans toutes les CR	Pulaar

ALPHABETISATION DES BENEFICIAIRES

REGION DE DIOURBEL

Nom de l'Organisation (Sigle)	Zones d'intervention	Langues d'intervention
CARITAS	BAMBEY	Wolof - Sereer
AHDIS	BAMBEY - DIOURBEL - MBACKE	Wolof
ALPHA 2000	BAMBEY	Wolof - Sereer
GROCEF	TOUBA - MBACKE	Wolof
ARP / DIOURBEL	DIOURBEL	Pulaar
ADIS	DIOURBEL	Wolof - Sereer
JID	MBACKE	Wolof - Sereer
UGROPAD	DIOUBEL - MBACKE	Wolof - Sereer

REGION DE TAMBACOUNDA

Nom de l'Organisation (Sigle)	Zones d'intervention	Langues d'intervention
ACUPROS	TAMBACOUNDA	Mandinka- Soninke Wolof
SODEFITEX	TAMBACOUNDA	Pulaar
ENVIRONNEMENT 2001	TAMBACOUNDA GOUDIRY	Pulaar
GRADIL	BAKEL	Soninke - Pulaar - Mandinka
GRACE	TAMBACOUNDA	Pulaar - Mandinka
CADRE	TERRES NEUVES	Mandinka- Wolof - Sereer
CEREM	TAMBA / MAKACOULI BANTA	Mandinka
ASSOCIATION ABK	BAKEL	Pulaar

DIFFICULTES

PERSPECTIVES



- **Mise en vigueur tardive du Projet par rapport à la date de signature de l'accord de prêt avec comme corollaire un retard dans la mobilisation du premier décaissement**
- **Lenteur dans le renouvellement des fonds du prêt BAD**
- **Mise en place tardive des fonds de la contrepartie et procédures de décaissement très longues**
- **Longueur des procédures de passation des marchés**

PERSPECTIVES

Production de la version finale du manuel de procédures pour l'alphabétisation

Sélection finale des 30 opérateurs en alphabétisation

Formation des :

40 formateurs (trices) : fin Janvier 2003

**60 superviseurs et 600 facilitateurs (trices) :
Février 2003**

**Acquisition des manuels d'alphabétisation :
Janvier à février 2003**

**Démarrage des classes d'alphabétisation :
Première phase : Mars 2003**

Mise en œuvre du plan de communication

Mise en œuvre du programme de renforcement des capacités des partenaires du Projet (appui institutionnel et formation)

**Démarrage des classes d'alphabétisation :
Deuxième phase : Juillet 2003**

Suivi/Supervision du Programme Alpha de formation et d'IEC

Démarrage des activités de crédit : Fév. 2003

Poursuite des activités d'encadrement technique des populations par les ONG

Recrutement définitif des spécialistes/cabinets chargés des formations thématiques et techniques des bénéficiaires et des partenaires prévu pour Janvier 2003

Mise en œuvre du Programme de formation des partenaires et bénéficiaires à partir de Mars 2003

Mise en place des équipements des CLEC à partir d'Avril 2003

Mission de suivi et supervision des activités de Microfinance et AGR avec la Cellule AT/CPEC à partir de Mars 2003

Evaluation à mi-parcours des activités de MF et AGR en juin 2003

Aménagement des Caisses populaires d'épargne et de crédit (CAPEC) dans certains complexes communautaires (Novembre 2003)

Démarrage des travaux des infrastructures socio-communautaires : Mai 2003, au terme de la procédure d'affectation des terrains et de recrutement des entreprises locales chargées des constructions par l'AGETIP

Finalisation de la procédure d'acquisition des équipements d'allégement en avril 2003 et Installation début Mai 2003

La procédure d'acquisition des équipements et mobiliers destinés aux infrastructures socio communautaires sera lancée après le démarrage des travaux de construction : Mai 2003

**Finalisation du DAO des ouvrages hydrauliques
en février 2003 et Démarrage des travaux en fin
Mai 2003**

**Acquisition des pompes hydrauliques à partir
de Juin 2003**

**Formulation du Programme d'accompagnement
du volet hydraulique : Fin Janvier 2003 et
Démarrage des activités d'animation /
sensibilisation / Formation : Avril 2003**

**Réunion du Comité National de Pilotage en
Janvier 2003**

**Mission de lancement des activités de terrain :
Janvier 2003**

**Atelier de mise en cohérence par rapport aux
objectifs du DSRP en Janvier 2003**

**Atelier de consolidation des acquis de la FNGPF
en février 2003**

Audit des comptes de l'exercice 2001 : Fév 2003

Audit des comptes Exercice 2002 : Juin 2003

Finalisation du processus d'acquisition du logiciel de gestion en février 2003

Revue à mi-parcours du Projet : Juin 2003

Coordination et Suivi / évaluation des activités du Projet


Mise à jour du Chronogramme des activités

Elaboration et suivi des demandes de renouvellement de fonds

BUDGET PREVISIONNEL 2003

COMPOSANTE	MONTANT	NIVEAU
Renforcement des capacités	1 211 000 000	39%
Micro-finance	2 202 000 000	60%
Infrastructures, Equipements et Hydraulique	4 195 364 500	61%
Gestion	280 140 000	80%
TOTAL	7 888 504 500	57%

Proportion de la population rurale ayant accès à une source d'approvisionnement en eau potable située à moins de 1 km

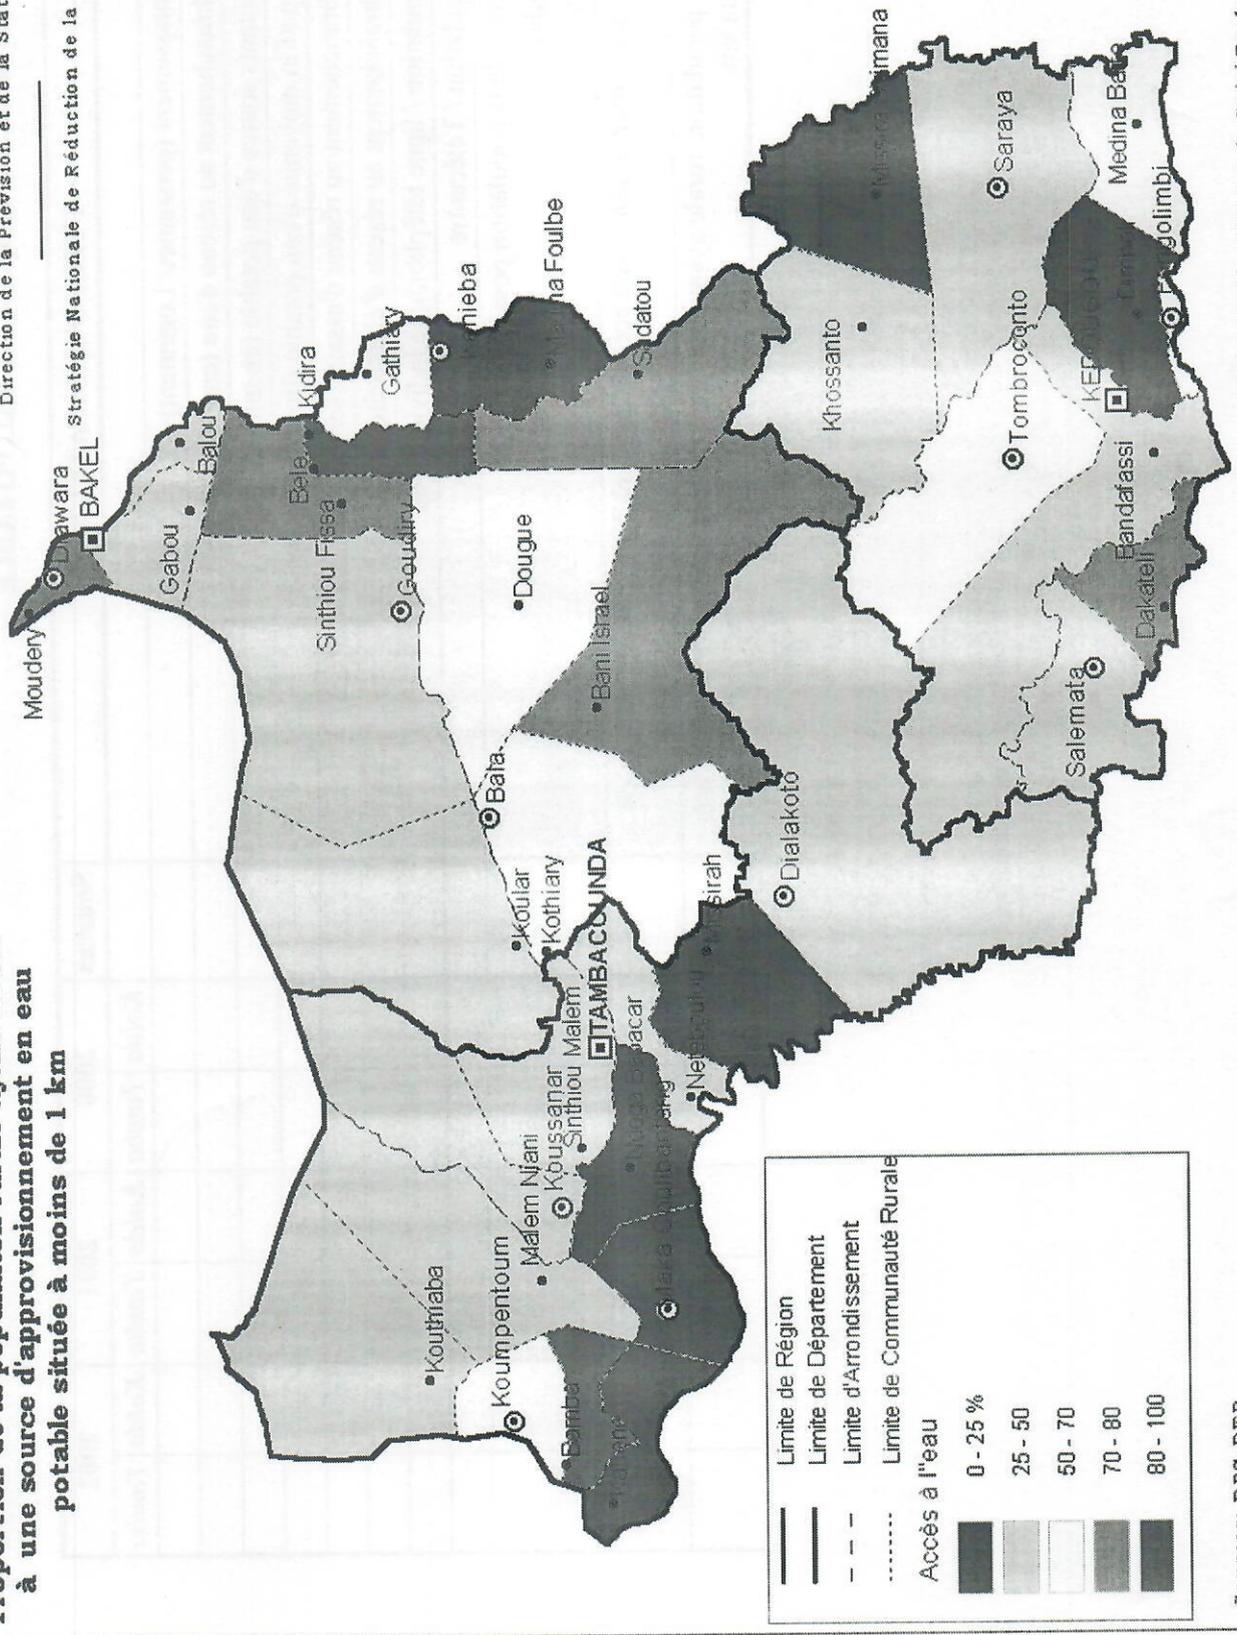

Sources: DPS-DER
 Accès aux services sociaux de base
 Avril 2000

Cartographie : Centre de Suivi Ecologique
 Mars 2001

5. HABITAT, LOGEMENT ET EAU POTABLE

	TYPES D'INDICATEURS						
	Sources	2000		2001		2002	
		<i>Kolda</i>	<i>Tamba</i>	<i>Kolda</i>	<i>Tamba</i>	<i>Kolda</i>	<i>Tamba</i>
Taux d'entassement (personnes/ Logement)							
Taux de branchement au réseau d'eau (en milieu urbain)							
Ratio habitants source d'eau potable (en milieu rural)							
Consommation moyenne d'eau potable (litres/ habitant/ jour)							
Taux de branchement au réseau d'assainissement des eaux usées							
Taux de branchement au réseau d'électricité							
Ratio population / ligne téléphonique individualisée							
Ratio population / Télécentre							
Pourcentage de la population possédant							
- radio							
- TV							
Part de la population rurale ayant accès à un point d'eau potable à moins de 1km							
Part de la population rurale ayant accès à un robinet ou une borne fontaine à moins d'un km							

ANNEXE 2 :
LISTE DE PRESENCE



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

**PROJET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
(FAD – FND)**

Réf : Prêt : FAD/N° F/SEN/LUT/PAU/99/22 du 19/08/99
Prêt : FND N° 286/du 25/05/99.

		et de la Solidarité Nationale	
13	Mamadou TOURE	APIMEC	839 86 60
14	Mamadou M. GUEYE	Direction de la Prévision et de la statistique	825 00 50 630 07 59
15	Ibrahima Papa MBOR	Ministère des Mines et de Hydraulique / Office National de l'Assainissement du Sénégal	835 10 68 835 78 04 / 05
16	Kallé SEYE	Ministère délégué chargé du Préscolaire et de la Case des tout Petits	685 33 54
17	El. Hadji Babacar DIOP	Ministère des Mines de l'Energie et de Hydraulique / Direction de l'Hydraulique et de l'Assainissement	832 42 79
18	Alioune MBAYE	Ministère de l'Education/ Direction du Préscolaire et de l'Enseignement Elémentaire	558 64 29
19	Aljouné SARR	Représentant Permanent de l'Association des Présidents de Conseils Régionaux (APR)	652 84 72 Tél/FAX 822 57 12
20	Mbaye DIAGNE NDIAYE	Conseil National de la Jeunesse	822 80 75 697 31 09
21	Laba CISSE DIOP	Fédération Sénégalaise des Associations de Personnes Handicapés	834 44 19
22	Abdou Kader DIOP	Fédération Sénégalaise des Associations de Personnes Handicapées	834 44 19
23	Banda DIEYE	Fédération Sénégalaise des Associations de Personnes Handicapées	632 70 44
24	Mayacine CAMARA	Cellule de Suivi Stratégique des Projets et Programme de Lutte Contre la Pauvreté/ DPS/MEF	823 88 91



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

PROJET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
(FAD – FND)

Réf : Prêt : FAD/N° F/SEN/LUT/PAU/99/22 du 19/08/99
Prêt : FND N° 286/du 25/05/99.

FEUILLE DE PRESENCE

OBJET : COMITE NATIONAL DE PILOTAGE DU PLCP

DATE : 10 JANVIER 2003

N°	NOM ET PRENOM	STRUCTURE	TELEPHONE
1	Yatma Mody NDIAYE	Ministère du Développement Social	849 71 11
2	Ousmane KA	Cellule de Suivi Opérationnel des Projets et Programme de Lutte Contre la Pauvreté (MDS)	823 69 19
3	Khady FALL NDIAYE	Projet de lutte Contre la Pauvreté	869 10 87
4	Madior DIOUF	Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée Nationale	821 68 01
5	FALL Gorgui Yérim	Ministère de l'Economie et des Finances / Direction de la Dette et de l'Investissement	821 23 25
6	GOUDIABY Thierno Ismaila	Fédération des Associations Féminines du Sénégal	827 29 54 Fax 827 24 15
7	Mme Awa DIA NIANG	Direction de la Famille MFSN	823 89 85
8	Ndeye Soukeyna Gueye SOW	Projet de Crédit pour les Femmes DF / PCF	8426642
9	Ndeye Mayé DIOUF	Ministère de l'Economie et des Finances / DCEF	822 35 62
10	Fatou GUEYE DIASSE	Fédération Nationale de Groupement de Promotion Féminine	864 23 91 864 13 57
11	Moussa DIENG	Cellule ATCPEC / MEF	821 22 67
12	Bernard Casimir CISSE	Ministère de la Famille et de la Solidarité Nationale / Direction de l' Action Sociale	842 28 13
