REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTERE CHARGE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

AGENCE DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL
(AFDS)

RAPPORT MENSUEL D'ACTIVITES

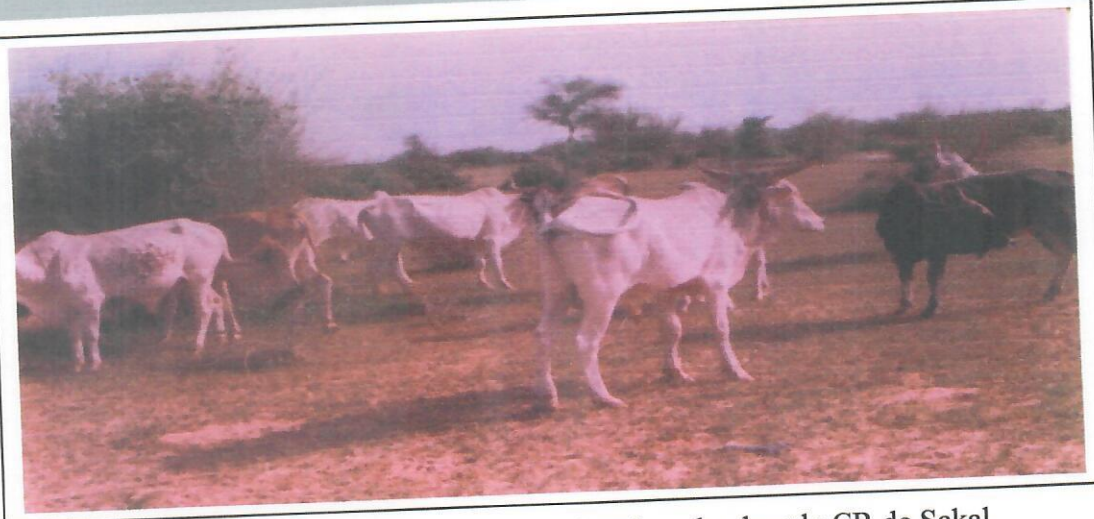

Quelques sujets d'un sous-projet d'embouche dans la CR de Sakal

OAMF : *GAMMA INGENIERIES*	**Mois : OCTOBRE 2004**
Région : LOUGA	**N° du Rapport : 22**
Département : LOUGA	**Date de dépôt : 08 Novembre 2004**

SOMMAIRE

Acronymes 3

Présentation générale des activités exécutées 4

Coordination régionale 5

Appui à la mise à jour des documents comptables 5

FGB/ Marketing à Syère 6

Suivi-vaccination des sujets à Sakal et Syère 6

Participation à la mission de l'auditeur interne de l'AFDS à Louga 6

Démarrage des auto-évaluations des sous-projets de Sakal 7

Contraintes et éléments de résolution 8

Effets récurrents de l'analphabétisme 9

Tableaux de synthèse 10

Rappel de la planification du mois 11

Etat d'exécution des activités prévues 11

Prévisions d'activités pour Novembre 2004 12

Fiche de collecte d'indicateurs 13

GAMMA INGENIERIES
OAMF – AFDS / Département de LOUGA
19, Rte de l'Aéroport LS SENGHOR, Dakar
33, Bd du Ndiambour, Louga, Tel/Fax: 967 04 77

ACRONYMES

AFDS : Agence du Fonds de Développement Social

ARFS : Antenne Régionale du Fonds Social

CASF : Comité d'Animation, de Sensibilisation et de Formation

CGSP : Comité de Gestion de Sous-Projets

CR : Communauté rurale

CTMO : Comité Technique de Mise en Œuvre

DSP : Demande de Sous-Projet

EPB : Evaluation Participative des Besoins

EPP : Evaluation Participative de la Pauvreté

IEC : Information Education Communication

MARP : Méthodes Actives de Recherche Participative

OADC : Opérateur d'Appui au Développement Communautaire

OAMF : Opérateur d'Appui à la Micro-Finance

OCB : Organisations Communautaires de Base

SP : Sous-Projet

GAMMA INGENIERIES
OAMF – AFDS / Département de LOUGA
19, Rte de l'Aéroport LS SENGHOR, Dakar
33, Bd du Ndiambour, Louga, Tel/Fax: 967 04 77

.1.
PRESENTATION GENERALE DES ACTIVITES EXECUTEES

GAMMA INGENIERIES
OAMF – AFDS / Département de LOUGA
19, Rte de l'Aéroport LS SENGHOR, Dakar
33, Bd du Ndiambour, Louga, Tel/Fax: 967 04 77

Le présent rapport fait le point sur l'état d'exécution des activités de *GAMMA INGENIERIES*, opérateur d'appui à la micro-finance pour le compte de l'AFDS dans le département de Louga durant le mois d'octobre 2004.

Ces activités s'articulent autour des points suivants :

- Coordination régionale
- Appui à la mise à jour des documents comptables à Sakal
- FGB à Syère sur le marketing
- Appui à la mise à jour des documents comptables à Syère
- Suivi-vaccination des sujets à Sakal et Syère
- Participation aux activités de la mission de l'auditeur interne de l'AFDS à Louga
- Démarrage des auto-évaluations des sous-projets de Sakal.

1. Coordination régionale

L'Opérateur a participé durant la journée du 6 octobre 2004 au siège de l'ARFS de Louga à une réunion de coordination régionale. Cette rencontre devenue classique dans la région, avait pour ordre du jour :

- Informations à partager
- Contraintes rencontrées dans la mise en œuvre des mandats

En ce qui concerne le premier point, ce qui suit a été évoqué :

- la fin du contrat de l'OAMF de Linguère
- la collecte des informations portant sur l'éducation
- les différences des coûts des DMP dans les différentes zones cibles de l'AFDS
- la réduction de la rémunération des maîtres d'œuvre
- les incidences de la baisse du coût du dollar
- la présélection de la deuxième vague des mutuelles.

Pour toutes ces informations qui ont été soulevées, les participants ont échangé des points de vue, enfin de capitaliser sur les expériences des uns des autres. A la suite de ces discussions une documentation notamment, les canevas améliorés des DMP et des DSP ont été remis aux opérateurs pour une bonne préparation des projets des communautés.

Au titre du point de l'ordre du jour, les opérateurs ont soulevé un certain nombre de contraintes rencontrées sur le terrain, notamment :

- la mobilisation des apports
- un manque de mobilisation sociale lors du dernier CTE de terrain dans le département de Linguère
- la pérennisation des sous-projets de Linguère
- difficulté de trouver un entrepreneur pour certains micro-projets.

2. Appui à la mise à jour des documents comptables

Suite au décaissement de la deuxième tranche à Sakal et à la première tranche à Syère, l'Opérateur a mené une campagne de suivi de l'effectivité des transactions qui ont été planifiées par les bénéficiaires. Pour le cas de la communauté rurale de Sakal, il était question

GAMMA INGENIERIES
OAMF – AFDS / Département de LOUGA
19, Rte de l'Aéroport LS SENGHOR, Dakar
33, Bd du Ndiambour, Louga, Tel/Fax: 967 04 77

de poursuivre un processus de mise en œuvre qui a été démarré depuis plusieurs mois. En ce qui concerne la communauté rurale de Syère, la campagne a été démarré le 13 octobre 2004 et a pris fin le 18 du même mois. Ces tournées ont permis à l'opérateur de faire le point des dépenses effectuées par les communautés et d'aider à mettre à jour les documents de gestion du sous-projets, notamment le journal de banque et le journal de caisse.. Les dépenses ont porté essentiellement sur l'achat des sujets à emboucher.

3. FGB à Syère sur le marketing

Le cinquième et dernier module de la formation en gestion de base à Syère a eu lieu dans la période du 7 au 11 octobre 2004. Il portait sur le marketing et a vu la participation :

- des représentants des 12 communautés cibles à raison de 4 par OCB porteuse de sous-projet
- de 4 relais communautaires de Syère
- des agents de l'Opérateur
- du formateur

Le plan du module comportait les sous thèmes ci-dessous :

- l'étude de marché
- les concurrents
- les clients
- le choix du produit
- Les prix
- Les canaux de distribution
- la promotion

La clôture de ce cinquième module qui marque la fin du déroulement de la FGB dans cette communauté rurale a été l'occasion pour les relais de la dite communauté rurale avec l'appui de l'Opérateur de mettre en place le bureau du réseau des relais de cette zone. Le moment était aussi choisi par les différents acteurs de mettre l'accent sur les stratégies de pérennisation des sous-projets des communautés.

4. Suivi et vaccination des sujets embouchés

Comme prévu dans le protocole de partenariat qui a été signé entre les OCB et le Service départemental de l'élevage de Louga, le premier passage de vaccination des sujets embouchés a été effectué par les agents de ce service dans les communautés rurales de Syère et de Sakal. Cependant lors de cette campagne de suivi de la vaccination des sujets, par l'Opérateur, la mort d'un bovin a été signalée par les communautés dans un villages de la communauté de Syère. Cette disparition a été causé par une double fracture aux jambes du bovin. L'Opérateur a recommandé d'en dressé procès verbal et demandé aux communautés, dans de pareilles circonstances, d'avertir l'agent vétérinaire le plus rapidement possible

5. Participation aux activités de la mission de l'auditeur interne de l'AFDS-siège

L'Opérateur a participé durant la semaine du 11 au 17 octobre 2004 aux activités de la mission de l'auditeur interne de l'AFDS dans la région de Louga. Il a tenu à informer les

GAMMA INGENIERIES
OAMF – AFDS / Département de LOUGA
19, Rte de l'Aéroport LS SENGHOR, Dakar
33, Bd du Ndiambour, Louga, Tel/Fax: 967 04 77

communautés de Sakal avant d'accompagner et d'introduire l'auditeur au sein du village où devait se tenir la rencontre de travail avec les communautés bénéficiaires.

L'Opérateur a, enfin, participé à la réunion de restitution des visites de terrain que l'auditeur a pu mener dans la région de Louga. Cette rencontre a été l'occasion pour ce dernier de rappeler aux acteurs que sa descente sur le terrain est une mission de suivi et d'appui aux opérateurs, dans l'esprit d'améliorer le processus de mise en œuvre des projets. Dans ce cadre, il a formulé les recommandations suivantes :

- la tenue des procès verbaux allégés par les secrétaires des OCB
- le classement des pièces justificatives
- la signature des PV de visite de sentier
- le rangement de tous les documents dans les mallettes
- le déroulement du module de gestion de boutique
- l'amélioration des PV de la commission d'achat
- la mise en place des accords de financement au niveau de la base

Cette réunion de partage des résultats de terrain de l'auditeur interne a été clôturée par une séance de travail sur le canevas de demande de tranche qui a fait l'objet de beaucoup de commentaires au niveau des opérateurs.

6. Démarrage des auto-évaluations des sous-projets

Après un démarrage total des sous-projets de la communauté rurale de Sakal, l'Opérateur vient d'enclencher un processus d'appui aux communautés dans l'exécution d'un exercice d'auto-évaluation. Pour ce faire, la journée du 26 octobre 2004 a été consacrée à la mise à niveau de l'équipe de l'Opérateur, renforcée par les relais communautaires, dans le cadre d'un processus de préparation de ces derniers à plus de responsabilité dans l'accompagnement des communautés. Au cour de cette journée, l'accent a été mis sur :

- la méthodologie
- les outils de travail
- l'objectif de l'auto-évaluation
- la qualité des informations à collecter
- les critères d'évaluation

L'auto-évaluation proprement dite porte essentiellement sur :

- la fonctionnalité du dispositif institutionnelle
- le niveau de maîtrise et d'appropriation des procédures de passation de marché
- le niveau d'approbation du système de gestion financière et comptable
- l'état d'exécution des plans de renforcement de capacité
- les stratégies de pérennisation des sous-projets

Ces auto-évaluations seront poursuivies dans la communauté rurale de Sakal tout au long du mois de novembre 2004.

GAMMA INGENIERIES
OAMF – AFDS / Département de LOUGA
19, Rte de l'Aéroport LS SENGHOR, Dakar
33, Bd du Ndiambour, Louga, Tel/Fax: 967 04 77

.2.
CONTRAINTES ET ELEMENTS DE RESOLUTION

GAMMA INGENIERIES
OAMF – AFDS / Département de LOUGA
19, Rte de l'Aéroport LS SENGHOR, Dakar
33, Bd du Ndiambour, Louga, Tel/Fax: 967 04 77

Effets récurrents du problèmes de l'analphabétisme

Dans le cadre des préparatifs liés aux cycles d'exploitation des sous-projets d'embouche, l'Opérateur avait organisé au niveau de chaque village cible des animations portant essentiellement sur les procédures d'acquisition des sujets à emboucher avec la mise en place d'un canevas du PV d'achat des sujets. Mais avec l'analphabétisme de certaines communautés, les commissaires de ces dernières sont revenus des marchés avec des bovins sont le remplissage du PV d'achat.

Face à cette situation, ces communautés ont procédé à la reconstitution des transactions une fois à la base avec l'appui de l'Opérateur.

GAMMA INGENIERIES
OAMF – AFDS / Département de LOUGA
19, Rte de l'Aéroport LS SENGHOR, Dakar
33, Bd du Ndiambour, Louga, Tel/Fax: 967 04 77

.3.
TABLEAUX DE SYNTHESE

GAMMA INGENIERIES
OAMF – AFDS / Département de LOUGA
19, Rte de l'Aéroport LS SENGHOR, Dakar
33, Bd du Ndiambour, Louga, Tel/Fax: 967 04 77

3.1. Rappel de la planification du mois

Activités	Indicateurs	Période d'exécution	Ressources	
			Humaines	Matérielles
Poursuite de l'appui à la mise à jour des documents comptables à Sakal	12 OCB à appuyer	Du 1er au 6	5	- véhicule -matériels informatiques - markers - tableaux padex
FGB à Syère	1 module à dérouler	Du 7 au 11	5	- véhicule -matériels informatiques - markers - tableaux padex
Appui à la mise à jour des documents comptables de Syère	12 OCB à appuyer	Du 12 au 20	5	- véhicule - matériels informatiques - markers - tableaux padex
Séminaire de formation des auxiliaires vétérinaires à Syère	27 auxiliaires à former	Du 21 au 31	5	- véhicule - matériels informatiques - markers - tableaux padex

3.2. Niveau de réalisation des activités

Activités	Réalisations			Indicateurs	Observations
	Oui	Non	Niveau de réalisation		
Poursuite de l'appui à la mise à jour des documents comptables à Sakal			Activité réalisée	21 OCB appuyées	- Seules 21 OCB étaient concernées par le décaissement
FGB à Syère			Activité entièrement réalisée	1 Module déroulé	- C'est ce seul module qui restait à dérouler
Appui à la mise à jour des documents comptables de Syère			Activité entièrement réalisée	10 OCB appuyées	- Les 2 autres OCB n'ont pas encore décaissé
Séminaire de formation des auxiliaires vétérinaires à Syère			Activité non réalisée		Lieu et place, vaccination des sujets embouchés à Syère

GAMMA INGENIERIES
OAMF – AFDS / Département de LOUGA
19, Rte de l'Aéroport LS SENGHOR, Dakar
33, Bd du Ndiambour, Louga, Tel/Fax: 967 04 77

3.3. Prévision d'activités pour le mois de novembre 2004

Activités	Indicateurs	Période d'exécution	Ressources	
			Humaines	Matérielles
Auto-évaluation des OCB bénéficiaires de sous-projets à Sakal	29 OCB à auto-évaluer	Du 1er au 22	8	- véhicule - matériels informatiques - markers - tableaux padex
Suivi des activités de mise en œuvre à Syère et au décaissement des SP restants	- 10 OCB à appuyer dans le suivi - 2 OCB à appuyer pour le décaissement	Du 8 au 22	3	- véhicule -matériels informatiques - markers - tableaux padex
Elaboration des demandes de deuxième tranche à Sakal	7 OCB à appuyer	Du 20 au 30	3	- véhicule -matériels informatiques - markers - tableaux padex

GAMMA INGENIERIES
OAMF – AFDS / Département de LOUGA
19, Rte de l'Aéroport LS SENGHOR, Dakar
33, Bd du Ndiambour, Louga, Tel/Fax: 967 04 77

3.4. Fiche de collecte des indicateurs

Indicateurs	Résultats		Observations
	Résultats du mois	Cumul	
Information / Communication			
Nombre de séances d'animation et d'information organisées	38	533	- 13 réunions à Syère - 25 réunions à Sakal
Nombre d'OCB sensibilisées et informées	40	612	Toutes les OCB porteuses de sous-projets
Réalisation des EPB			
Nombre d'EPB réalisées	-	40	40 villages sont ciblés
Nombre de SP exprimés	-	41	1 DSP par village sauf Sakal village qui a deux DSP
Nombre de rapports EPB élaborés	-	42	- 40 rapports EPB villages - 2 rapports de synthèse pour les 2 CR cibles
Mise en place des comités du SP			
Nombre de CGSP mise en place	-	41	Tous les comités sont montés
Nombre de membres par CGSP	-	6	Compte non tenu de deux commissaires aux comptes
Nombre de femmes en moyenne présentes dans le CGSP	-	5	Majorité femmes
Nombre de jeunes en moyenne présents dans le CGSP	-	2	La tranche d'âge des jeunes est touchée par l'exode rural
Préparation des DSP			
Nombre de DSP préparées par les OCB	-	42	1 DSP par village, sauf Sakal où 2 DSP ont été identifiés
Nombre de DSP destinés aux femmes	-	32	Majorité de femmes
Nombre de DSP évaluées par le CTE	-	42	Les deux CR ont vu leur SP évalués
Nombre de DSP validées par le CTE	-	40	Seul un village a vu son SP ajourné 2 fois
Nombre de DSP financés	1	38	Seuls 2 SP ne sont pas encore financés
Exécution des sous-projets			
Nombre de SP démarrés	1	38	Seuls 2 SP n'ont pas encore démarrés
Nombre de SP en maturité	-	6	- 2 SP de commerce ruraux - 4 SP de central d'achat

GAMMA INGENIERIES
OAMF – AFDS / Département de LOUGA
19, Rte de l'Aéroport LS SENGHOR, Dakar
33, Bd du Ndiambour, Louga, Tel/Fax: 967 04 77
